

도 로 과

보고 순서

I . 일반현황	59
II . 2024년 주요업무 추진실적 및 향후계획	
1. 북아현 재정비촉진구역 내 과선교 설치공사	61
2. 독립문 문화공원 지하공영주차장 조성	63
3. 도로개설 사업	65
4. 도로 및 도로시설물 정비사업	72
5. 겨울철 제설대책 추진사업	79
6. 보도 및 보도시설물 정비사업	85
7. 도로굴착복구 및 불량맨홀 정비사업	91
8. 세검정로1길 보행자우선도로 조성	93
9. 대중교통 편의제공을 위한 스마트쉼터 확대 설치	95
10. 가로변 마을버스정류소 온열의자 확대 설치	97
11. 지하안전 관리 및 관내 공동탐사 용역	99
12. 가로등·보안등 보수 및 개량사업	103
13. 범죄사각지대 해소를 위한 안산산책로 보안등 설치사업 ...	107
14. 서대문 명소 홍보조명 설치 사업	109

I. 일반 현황

1. 직원현황(2024. 6. 15. 현재)

(단위 : 명 / 괄호안 성비)

구 분	계	일반직									별정직
		행정직 + 기술직						관리 운영직	전문 경력관	임기제	
		소계	5급	6급	7급	8급	9급				
정 원	39	39	1	8	15	5	6	-	-	4	-
현 원	39 (29/10)	39 (29/10)	1 (1/0)	8 (8/0)	10 (7/3)	9 (6/3)	7 (4/3)	-	-	4 (3/1)	-
과부족	-	-	-	-	△5	4	1	-	-	-	-

2. 팀별 업무분장

팀 별	분 장 업 무
도 로 계 획	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로 및 토목공사 계획수립 및 집행 ◦ 도시계획시설(도로) 시행인가, 공사설계 및 감독 ◦ 비관리청 도로시설공사의 허가
도 로 관 리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로 및 도로시설물 유지관리 보수 ◦ 지하보도 관리 ◦ 제설작업의 계획 및 실시
보 도 관 리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보도유지관리 및 보도점검·보수 사업 ◦ 보도환경순찰 및 민원처리 업무 ◦ 보도대장 관리 및 보도 통계 업무
도 로 굴 착	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로굴착복구사업 관리 및 승인 ◦ 불량맨홀 정비사업 관련 업무
교 통 시 설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대중교통 시설관리 업무 ◦ 교통체계 개선 및 교통안전시설물 설치 및 관리 ◦ 자전거이용활성화 증진 사업 및 어린이·노인보호구역 개선 사업
지 하 안 전	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지하안전관리 계획수립 및 지하안전평가 승인 관련업무 ◦ 안전관리규정 심사 및 지하시설물 안전관리 실태 점검 ◦ 지반침하위험도평가(공동탐사 용역) 및 중점관리대상 지정
도 로 조 명	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로조명(기전)시설 유지관리 ◦ 도로조명시설의 공사계획 및 집행 ◦ 도로조명시설 설계 시공 및 감독

3. 기반시설

○ 도로

도로율	도로연장	도로면적	포장율	포장연장	포장면적	보도면적
17.25%	311km	2,744km ²	100%	311km	2,744km ²	0.283km ²

※ 서울시 평균 도로율 : 23.20%

○ 폭원별 도로 분류

구분	폭원(m)	도 로			포 장	
		연장(m)	면적(m ²)	비율(%)	연장(m)	면적(m ²)
계		311,206	2,744,932	100	311,206	2,744,932
광 로	40이상	5,917	236,870	8.6	5,917	236,870
대 로	25~40미만	28,429	801,493	29.2	28,429	801,493
중 로	12~25미만	24,288	405,117	14.8	24,288	405,117
소 로	4~12미만	252,572	1,218,050	44.4	252,572	1,218,050
광 장	4 개소		83,402	3.0		83,402

4. 도로 시설물 현황

(단위 : 개소)

구분	계	교량	보도육교	지하보도	입체교차로	차도육교	터널	굴다리	고가차도	옹벽석축	지하차도	가로등	보안등	보도육교승강기
계	16,980	23	7	2	1	2	1	1	4	29	3	7,444	9,461	2
구청	15,534	15	7	2	-	2	-	1	-	29	-	6,015	9,461	2
서부도로사업소	1,446	8	-	-	1	-	1	-	4	0	3	1,429	-	

5. 보유장비 현황

(단위 : 대)

계	제설차	덤프트럭	제설삽날	염화칼슘살포기	캣타기	지게차	로더
43	1	3	6	29	1	1	2

6. 버스정류소

(단위 : 개소)

계(개소)	간선	지선	간·지선	광역	중앙	공항	마을버스	기타(시외)
549	8	78	75	1	48	40	298	1

II. 2024년 주요업무 추진현황 및 향후계획

1	북아현 재정비촉진구역 내 과선교 설치공사	계속
----------	-------------------------------	-----------

도로과

도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로계획팀장: 정기찬 ☎1759 담당: 김대호 ☎1770

경의·중앙선 횡단으로 단절된 북아현1-1구역과 1-2구역 간 도로교 및 녹지교를 설치하여 지역주민 불편 해소와 휴식공간을 제공하고자 함

사업개요

- 위 치 : 서대문구 북아현동 1011-10번지 일대
- 규 모 : 도로교 B=20m, L=52m, 녹지교 B=29m, L=42m
연결도로 개설 L=255m, B=12~20m
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2025. 2.
- 사업내용 : 경의·중앙선 상부 횡단 도로교 및 녹지교 설치
- 총사업비 : 17,000,000천원(민간 예치금)

추진현황

- 2023. 02. : 시설공사 착공 및 감리 착수
- 2023. 09. : (힐스테이트 측) 도로교 및 녹지교 교대 기초공사 완료
- 2024. 01. : (힐스테이트 측) 도로교 및 녹지교 교대 설치 완료
- 2024. 04. : 교량 거더 제작 착공
- 2024. 05. : (푸르지오 측) 도로교 교대 및 녹지교 교각 기초공사 완료
- 2024. 07. : (힐스테이트 측) 임시도로 2개소 설치완료 및 개통

○ **소요예산 및 집행현황**

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	17,000,000	4,100,888	36.8	
기타	17,000,000	4,100,888	36.8	예치금

향후계획

- 2024. 08. : (힐스테이트 측) 교량 높이에 맞추어 연결도로 성토공사 완료
- 2024. 08. : (푸르지오 측) 도로교 교대 및 녹지교 교각 설치 완료
- 2024.09. ~ 11. : 거더제작 및 교량 상부 구조물 설치 완료
- 2024.12. : 포장 및 도로교 개통

위치도 및 조감도



2	독립문 문화공원 지하공영주차장 조성	계속
----------	----------------------------	-----------

도로과 도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로계획팀장: 정기찬 ☎1759 담당: 도기환 ☎8020

독립문 문화공원 리모델링 및 지하주차장 조성을 통해 주변경관 개선에 기여하고 영천시장 방문객과 지역주민에게 주차편의를 제공

사업개요

- 위 치 : 서대문구 영천동 263 일대
- 규 모 : 지하1층 ~ 지하3층, 연면적 6,080.88㎡, 120면
- 사업기간 : 2021. 12. ~ 2024. 10.
- 사업내용 : 지하주차장 건립, 공원 리모델링
- 총사업비 : 33,080,000천원
 - 국비 7,200,000천원, 시비 5,040,000천원, 구비 10,960,000천원, 특교금 9,880,000천원

추진현황

- 2021. 12. : 공사 착공
- 2022. 03. ~ 11. : 지장물 철거 및 RPP 방음벽 시공, CIP 천공
- 2022. 12. ~ 2024. 02. : 가시설, 토공(기초) 공사 완료
- 2024. 02. ~ 06. : 건축 골조 작업 진행

○ **소요예산 및 집행현황** (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	33,080,000	19,660,684	63.3	
국 비	7,200,000	7,200,000	100	
시 비	5,040,000	5,040,000	100	
구 비	10,960,000	2,183,667	19.9	
특교금	9,880,000	6,520,754	65.9	

3	도로개설 사업	신규 · 계속
----------	----------------	----------------

도로과 도로과장: 최종구 ☎830-1758 도로계획팀장: 장기찬 ☎1759 담당: 도기환, 임승재, 김보미, 황수민 ☎8020, 1762, 1760, 1764

관내 도로개설 사업을 통하여 지역주민 교통 불편 해소 및 쾌적한 도로환경을 개선하고, 장기미집행 도시계획시설(도로)사업의 집행으로 사유재산권 보호와 도시계획시설 실효를 해소하고자 함

사업개요

○ **추진방향**

- 도로개설 사업을 통하여 교통 불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성
- 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업의 집행으로 사유재산권 보호와 도시계획시설 실효 해소

○ **총사업비 : 13,441,892천원**

- 시비 2,557,008천원, 구비 10,884,884천원

추진현황 및 목표(2024. 6. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 도로개설 사업	건	1	2	4	4
◦ 장기미집행 도시계획(도로)시설 개설	건	4	1	1	1

[2024년 주요 추진현황]

1 도로개설 사업 신규 계속

○ **신촌동 금화터널 인근 도로개설 공사**

- 사업개요
 - 위치 : 이화여대 산학협력관 ~ 신촌동 1-9(봉원사 2길)
 - 사업규모
 - (신설)봉원동 45-1 ~ 봉원동 1-37 : B=9.0m, L=88m
 - (확장)신촌동 1-52 ~ 봉원동 41-6 : B=6.0m, L=164m
 - 사업기간 : 2022년 9월 ~ 2025년 6월

- 추진현황 및 향후계획


- ▶ 2022. 8. : 사업추진 계획 수립
- ▶ 2022. 12. ~ '23. 3. : 타당성 용역 시행
- ▶ 2023. 3. ~ '24. 1. : 도시계획시설(도로) 결정, 실시계획 작성을 위한 열람 공고 및 중토위 사업인정 협의 실시
- ▶ 2023. 11. : 기본 및 실시설계용역 시행 및 착수
- ▶ 2024. 01. : 도로 노선 측량(중심선, 종·횡단) 및 지반 조사 실시
- ▶ 2024. 01. : 도시계획시설(도로) 실시계획 작성 고시
- ▶ 2024. 01. ~ 12. : 손실보상 시행 및 완료
- ▶ 2024. 08. : 기본 및 실시설계 완료, 공사 발주
- ▶ 2025. 06. : 사업 완료 및 도로 개통

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	7,070,000	-	-	
구비	7,070,000	-	-	

□ 위치도 및 현장사진

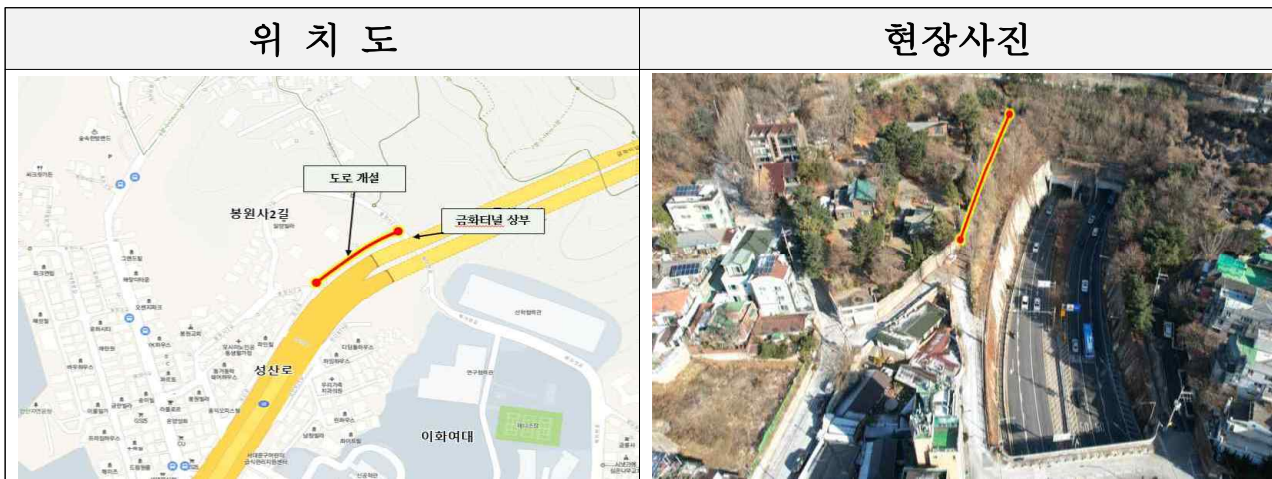

○ 통일로20길 도로확장공사

- 사업개요

- ▶ 위 치 : 서대문구 홍제동 40-248 ~ 40-274
- ▶ 사업규모 : 도로개설 (연장 210m, 폭 6~8m)
건축물 해체 4개소 등
- ▶ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2024. 12.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2022. 12. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시
- ▶ 2023. 3. ~ 6. : 실시설계용역 시행
- ▶ 2023. 4. ~ 9. : 손실보상 협의
- ▶ 2023. 10. : 수용재결 시행
- ▶ 2023. 10. : 공사발주
- ▶ 2024. 5. ~ 12. : 공사시행 및 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	730,000	70,917	9.7	
시비	200,000	-	-	
구비	530,000	70,917	13.4	

□ 위치도 및 현장사진



○ **충정로3가 184-4 ~ 190-25간 도로개설공사**

- 사업개요

- ▶ 위 치 : 서대문구 충정로3가 184-4~190-25
- ▶ 사업규모 : 도로개설 (연장 189m, 폭 6m), 건축물 해체 3개소 등
- ▶ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2020. 6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획작성 고시
- ▶ 2021. 4. ~ 6. : 손실보상 협의 시행
- ▶ 2021. 9. ~ 12. : 실시설계용역 시행
- ▶ 2021. 12. ~ 2022. 11. : 공사 시행(1단계 구간)
- ▶ 2022. 11. : 공사발주(2단계 구간)
- ▶ 2023. 1. ~ 9. : 계고장 발송 및 변상금 부과(충정로7길 29-20)
- ▶ 2024. 4. : 토지 및 건축물 명도소송 제기(충정로7길 29-20)
- ▶ 2024. 5. ~ 6. : 우선 시행 추진구간 공사시행 및 준공

○ **소요예산 및 집행현황**

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	1,353,000	655,392	48.4	
시비	296,000	296,000	100	
구비	1,057,000	359,392	34.0	

□ **위치도 및 현장사진**

위 치 도	현장사진
	

○ 연희로36~연희대우아파트 간 도로개설공사

- 사업개요

- ▶ 위 치 : 연희로 36 ~ 연희로 38-20
- ▶ 사업규모 : 보도정비 5a, 측구 및 경계석 정비 250m 등
- ▶ 사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 7.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2023. 2. : 공사발주 및 계약
- ▶ 2023. 3. ~ 2024. 6. : 공사중단(도로개설 반대민원으로 본 사업 미착공 및 사고이월)
- ▶ 2024. 7. ~ : 주민의견 수렴(교통량 조사) 후 공사 시행

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	200,000	0	0	
구비	200,000	0	0	

위치도 및 현장사진



② 장기미집행(도로)사업 계속

○ 홍은2동 203-2~188-9간 도로개설

- 사업개요

- ▶ 위 치 : 홍은2동 203-2~188-9
- ▶ 사업규모 : 도로개설 연장 572m, 폭 6m
- ▶ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 12.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2020. 6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획작성 고시
- ▶ 2022. 4. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시
- ▶ 2023. 1. ~ 2023. 5. : 손실보상 협의 시행
- ▶ 2023. 11. : 수용재결
- ▶ 2024. 5. : 중토위 이의재결 완료
- ▶ 2024. 6. : 공탁

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	4,088,892	2,062,653	50.5	
시비	2,061,008	2,061,008	100	
구비	2,027,884	1,645	0.08	

위치도 및 현장사진

위 치 도	현장사진
	
홍은2동 203-2~188-9간 도로개설 (연장 572m, 폭 6m)	

소요예산(도로개설사업 + 장기미집행(도로)사업)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	13,441,892	2,788,962	20.7	
시비	2,557,008	2,357,008	92.2	
구비	10,884,884	431,954	4.0	

기대효과

- 도로개설 사업을 통하여 지역 교통 불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성
- 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업의 집행으로 사유재산권 보호와 도시계획시설 실효 해소

4	도로 및 도로시설물 정비사업	신규 · 계속
----------	------------------------	----------------

도로과	도로과장: 최종구 ☎830-1758 도로관리팀장: 김군성 ☎1766 담당: 송이슬, 산재훈, 한지훈 ☎1767, 1761, 8021
------------	---

관내 노후·파손된 도로와 도로시설물을 적기에 정비하고 지속적인 유지관리로 주민들의 불편을 해소하고, 안전사고 예방과 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

○ **사업목적**

- 노후화된 도로 및 도로시설물 적기에 정비하여 민원 해소 및 쾌적한 도로 환경 조성에 기여

○ **사업위치** : 관내 일원

○ **사업기간** : 2024. 1. ~ 12.

○ **총사업비** : 6,938,207천원

- 시비 610,707천원, 구비 6,327,500천원

추진현황 및 목표(2024. 6. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 도로시설물 보수·보강공사	건	1	-	1	1
◦ 도로시설물 정밀안전진단 및 점검용역	건	-	-	3	3
◦ 청련사 진입도로 정비(확장)공사	건	-	-	1	1
◦ 미동초교 앞 보도육교 엘리베이터 설치공사	건	-	-	1	1

【 2024년 주요 추진현황 】

① 2024년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 계속

○ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업규모
 - 아스콘포장 114a, 콘크리트포장 8a
 - 측구 정비 615m, 도로경계석 설치 565m

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 11. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,460,000	340,000	23.3	

② 2024년 관내 도로시설물 유지보수 공사(연간단가) 계속

○ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업규모
 - 구조물보수 500㎡, 계단보수 2,000㎡
 - 안전난간 및 디자인난간 설치 500m, 미끄럼방지 포장 24a 등

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 11. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	900,000	510,000	56.7	

3 도로시설물 보수·보강공사 신규

○ 사업개요

- 위 치 : 증산3교 등 12개소
- 사업규모 : 도로시설물 보수·보강공사 1식
 - 증산3교 등 12개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역결과 ('24. 3월 말)에 따라 실시설계 용역 및 시설물 보수·보강공사 시행

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 6. ~ 8. : 실시설계 용역 시행
- 2024. 9. ~ 11. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,381,000	6,974	0.5	연대앞 지하보도 점검구 설치비

4 도로시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 신규

【증산3교 등 12개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역】

○ 사업개요

- 용역내용 : 관내 도로시설물 정밀안전진단(9개소), 정밀안전점검(3개소)
- 과업내용
 - 시설물 현황 및 시설물 정밀 외관조사(상태평가)
 - 구조물 해석에 따른 안전성 평가 및 보고서 작성 등
- 진단대상(9개소)
 - 증산3교, 옥천3교, 연대 앞 지하보도, 연희초교 앞 보도육교, 홍제초교 앞 보도육교, 금화터널입구 차도육교, 연희굴다리, 홍제천복개(1), 불광천복개
- 점검대상(3개소)
 - 교남 지하보도, 연대병원 앞 보도육교, 세검정로 옹벽(2)

○ 추진현황 및 향후계획

- 2022. 7. : 용역 착수
- 2024. 2. : 서울시 정밀안전진단 심의 완료
- 2024. 3. : 용역준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	850,500	759,338	89.3	

【홍은대교 등 40개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역】

○ 사업개요

- 용역내용 : 관내 도로시설물 정밀안전진단(16개소), 정밀안전점검(25개소)
- 과업내용
 - ▶ 시설물 현황 및 시설물 정밀 외관조사(상태평가)
 - ▶ 구조물 해석에 따른 안전성 평가 및 보고서 작성 등
- 진단대상(16개소)
 - ▶ 홍은대교, 홍제3교, 연가교, 홍전교, 충정2교, 보도교, 해담는다리, 무명교, 옥천2교, 구서울여상 앞 보도육교, 아현고가 밑 보도육교, 금화초교 앞 보도육교, 홍제천 복개(2), 홍제천 복개(3), 세검정로 옹벽(1), 연세로4길 옹벽
- 점검대상(25개소)
 - ▶ 석축 : 백련사길, 연희로, 성산로, 연희맛로
 - ▶ 옹벽 : 증가로(1), 증가로(2), 응암로, 가좌로, 통일로(1), 통일로(2), 연희로(1), 연희로(2), 성산로(1), 성산로(2), 성산로(3), 성산로(4), 홍제천로, 연세로4길, 홍은동센트레빌, 연희로41가길, 문화촌길, 충정로3가, 연희맛로(1), 연희맛로(2)
 - ▶ 절토사면 : 세검정로

○ 추진현황 및 향후계획

- 2023. 5. : 용역 착수
- 2024. 4. : 과업내용 변경(재하시험, 내진성능평가 등)
- 2024. 10. : 구 정밀안전진단 심의
- 2024. 12. : 용역 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,232,000	472,500	38.4	선금

【옥천교 등 3개소 정밀안전진단 용역】

○ 사업개요

- 용역내용 : 관내 도로시설물 정밀안전진단(4개소), 정밀안전점검(1개소)
 - 과업내용
 - 시설물 현황 및 시설물 정밀 외관조사(상태평가)
 - 구조물 해석에 따른 안전성 평가 및 보고서 작성 등
 - 진단대상(4개소)
 - 옥천교, 흥은교, 포방교, 증가로 차도육교
 - 추가 과업대상(1개소)
 - 무악재 하늘다리
- ※ 무악재 하늘다리 등 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역으로 도로 시설물 2개소에 대한 진단 및 점검용역을 별도 발주 할 경우 예정가격이 작아 이행 능력 및 기술 능력이 있는 업체와 계약하기 어려운 관계로 옥천교 등 3개소 정밀안전진단 용역에 해당 사업을 포함하여 수행

○ 추진현황 및 향후계획

- 2023. 12. : 용역 착수
- 2024. 5. : 과업내용 변경(추가)
- 2024. 8. : 구 정밀안전진단 심의
- 2024. 10. : 용역 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	265,000	-	-	
시비	211,000	-	-	
구비	54,000	-	-	

5 청련사 진입도로 정비(확장)공사 신규

○ 사업개요

- 위치 : 홍제동 13-77(청련사 진입도로)
- 사업규모
 - ▶ 도로 폭 확장 B=3.0~3.5m → B=4~4.5m, L=70m

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 실시설계 용역 발주 및 계약
- 2024. 2. ~ 6. : 용역시행
- 2024. 7.~9. : 공사시행
- 2024. 10. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	450,000	-	-	

○ 위치도 및 현장사진



6 미동초교 앞 보도육교 엘리베이터 설치공사 신규

○ 사업개요

- 위치 : 충정로2가 160-3(미동초교앞 보도육교)
- 사업규모
 - ▶ 미동초교앞 보도육교 엘리베이터 설치 : 2개소

○ 추진현황 및 향후계획

- 2023. 11.~12. : 공사 발주 및 계약
- 2024. 2. : 공사 일시 중지(지장물 이설비용 등 사업비 부족)
 - ▶ 부족 예산 : 1,853,911천원(관급비 199,833천원, 이설비 1,630,408천원, 전기공사비 23,670천원)
- 2024. 4. : 서울시 추경 예산 편성 요청

○ 현안사항


- 현장의 위치가 지하철 노선(서대문역~충정로역 사이) 상부며, 굴착이 수반되는 공사로 서울교통공사와 협의 및 지장물(광케이블 등) 이설 등이 선행되어야 하나 관련 사업비 부족으로 공사 일시 중지

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	399,707	-	-	
시비	399,707	-	-	

○ 위치도 및 현장사진

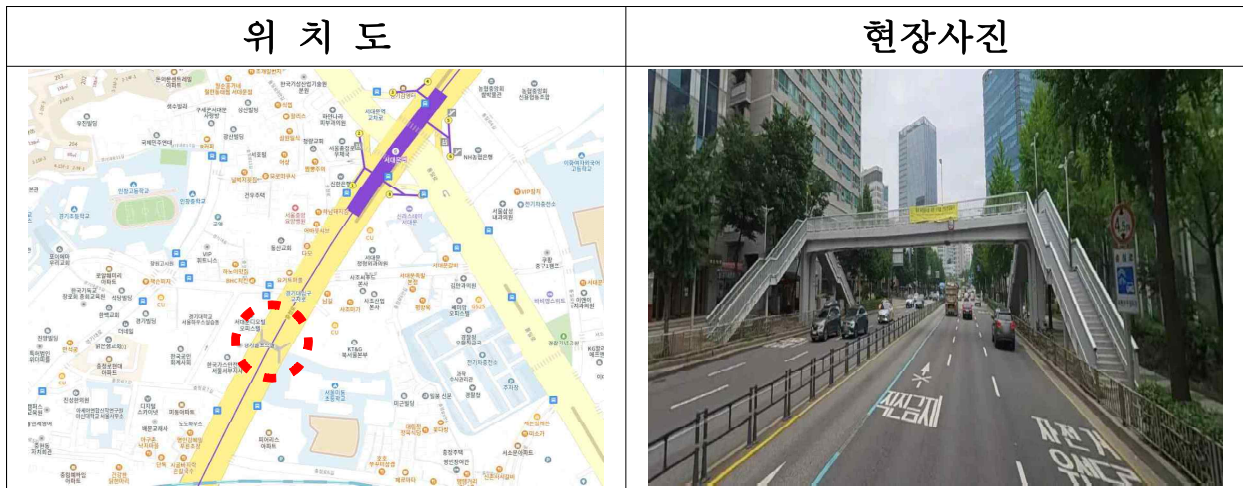

□ 소요예산 (2024년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)외 5개사업)

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	6,938,207	2,088,812	30.1	
시비	610,707	-	-	
구비	6,327,500	2,088,812	33.0	

□ 기대효과

- 도로 및 도로시설물 적기 정비를 통한 안전사고 예방
- 쾌적한 도로 환경 조성 및 도시미관 개선

5

겨울철 제설대책 추진사업

신규 · 계속

도로과

도로과장: 최종구 ☎830-1758 도로관리팀장: 김근성 ☎1766 담당: 송이슬 신재훈 정재욱 ☎1767, 1761, 1875

겨울철 설해 등 자연재해를 대비한 철저한 제설대책 추진으로 차량통행 불편을 해소하고 안전사고 예방

 사업개요

○ 사업목적

- 겨울철 폭설과 결빙 등으로 인한 차량 통행불편 해소 및 안전사고 예방

○ 사업위치 : 관내 일원

○ 사업기간 : 2024. 11. 15. ~ 2025. 3. 15.

○ 총사업비 : 2,750,525천원

- 시비 15,600천원 구비 910,328천원 구 재난관리기금 474,597천원 특별교부금 1,350,000천원

 추진현황 및 목표(2024. 6. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 2024/2025년 제설대책 용역	건	1	1	0	1
◦ 이동식 염수살포장치 임차용역	개소	7	11	0	11
◦ 제설도구함 구매 및 설치	개소	-	-	0	16
◦ 도로과 제설발전기지 및 장비·자재창고 설치공사	건	-	-	1	1

【 2024년 주요 추진현황 】

① 2024/2025년 제설작업 용역 계속

○ 사업개요

- 위치 : 관내 주요간선도로 및 이면도로

- 사업규모 : 총 25개 노선(연장 32.2km)

- 향후계획
 - 2024. 10. : 용역발주
 - 2024. 11. ~ 2025. 3. : 제설용역 시행
 - 2025. 3. 15. : 용역준공

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	110,000	-	-	

② 이동식 염수살포장치 임차용역 계속

- 사업개요
 - 용역내용 : 관내 제설취약구역 이동식 염수살포장치 설치 및 유지보수
 - 설치대상 : 서대문우체국 등 11개소

- 향후계획
 - 2024. 10. : 용역발주
 - 2024. 11. ~ 2025. 3. : 제설용역 시행
 - 2025. 3. 15. : 용역준공

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	77,000	-	-	

③ 제설대책관련 제설도구함 구매 및 설치 신규

- 사업개요
 - 위치 : 관내 제설 취약구역
 - 사업규모 : 이면도로 등 제설취약구역 약 16개소

- 향후계획
 - 2024. 10. : 제설도구함 구매·설치

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
시비	15,600	-	-	

④ 도로과 제설발전기지 및 장비·자재창고 설치공사 신규

○ 사업개요

- 위치 : 홍제동 454-1(유원하나 APT 옆)
- 사업규모
 - ▶ 부지조성(암파쇄 및 반출 V=2,539m³, 바닥정비)
 - ▶ 외곽웬스 및 웬스기초 설치
 - ▶ 제설 장비·자재 창고 및 사무실 설치

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2 ~ 2024. 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 4. ~ 2024. 5. : 도면 보완설계, 가설울타리(방음벽) 설치
- 2024. 6. : 공사 시행
- 2024. 9. : 공사 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	2,547,925	676,536	27.6	
특별교부금	1,350,000	495,728	36.7	
구비	723,328	180,808	25	
구 재년관리기금	474,597	-	-	

○ 위치도 및 현장사진

위 치 도(유원하나 아파트)	현장사진
	

소요예산 (2024/2025년 제설대책 용역 외 3개 사업)

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	2,750,525	676,536	24.6	
시비	15,600	-	-	
구비	910,328	180,808	19.9	
구 재난관리기금	474,597	-	-	
특별교부금	1,350,000	495,728	36.7	

기대효과

- 겨울철 도로결빙 등으로 인한 주민·차량 통행불편 해소 및 안전사고 예방

위치도 및 현장사진

- 이동식 염수 살포장치

<p>1. 위치도(서대문우체국)</p>	<p>현황사진</p>
<p>2. 위치도(연희로11자길 앞)</p>	<p>현황사진</p>
<p>3. 위치도(명지길 114)</p>	<p>현황사진</p>



4. 위치도(홍은동 190-7)



현황사진



5. 위치도(교수단지)



현황사진



6. 위치도(대현교회 앞)



현황사진



7. 위치도(성산로11길 40 일대)



현황사진



8. 위치도(홍제1동 주민센터)



현황사진



9. 위치도(세검정로4나길 30 앞)



현황사진



10. 위치도(북아현동 1-336 일대)



현황사진



11. 위치도(연희동 1-86, 연희동 1-65, 연희동 1-49)



현황사진

도로과

도로과장:최중구 ☎330-1758 보도관리팀장:홍상필 ☎1172 담당: 김태환, 차원근 ☎1768, 8595

관내 노후 및 파손된 보도를 적기에 정비하고, 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설등을 정비하여 보행안전과 교통약자의 이동편의를 개선하고자 함.

 사업개요

○ 추진방향

- 노후 보도정비를 통하여 안전하고 쾌적한 보행환경 조성
- 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설등을 정비하여 교통약자 이동편의 증진

○ 보도현황

- 보도연장 : 104,249m
 - ▶ 시도 : 통일로 등 13개 노선 45,086m
 - ▶ 구도 : 거북골로 등 108개 노선 59,163m
- 보도면적 : 283,721㎡[시도 124,268㎡, 구도 159,453㎡]

○ 총사업비 : 4,256,000천원

- 시비 2,112,000천원, 구비 1,644,000천원, 특별교부금 500,000천원

 추진현황 및 목표(2024. 6. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 관내 보도유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 노후보도 정비사업	건	5	2	4	4
◦ 보행환경 개선사업	건	-	-	1	1

【 2024년 주요 추진현황 】

① 2024년 관내 보도유지보수공사(연간단가) 계속

○ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업규모
 - 보도정비 90a, 측구 및 경계석 정비 1,500m
 - 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비 50개소
 - 디자인형 울타리 500m 설치 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2.~3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 12. : 공사시행(공정율 : 50%)
- 2024. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	1,706,000	282,383	16.55	
시비	856,000	110,513	12.91	
구비	850,000	171,870	20.22	

② 노후보도 정비사업 신규

【성산로 노후보도 정비공사】

○ 사업개요

- 위 치 : 연희동 375-11 ~ 연희동 218-1
- 사업규모
 - 보도정비 18a, 측구 및 경계석 정비 900m, 가로수 보호판 정비 79개소 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 9.

○ 추진현황


- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 6. : 공사시행
- 2024. 6. 28. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
시비	800,000	776,361	97.05	

○ 위치도 및 완료사진

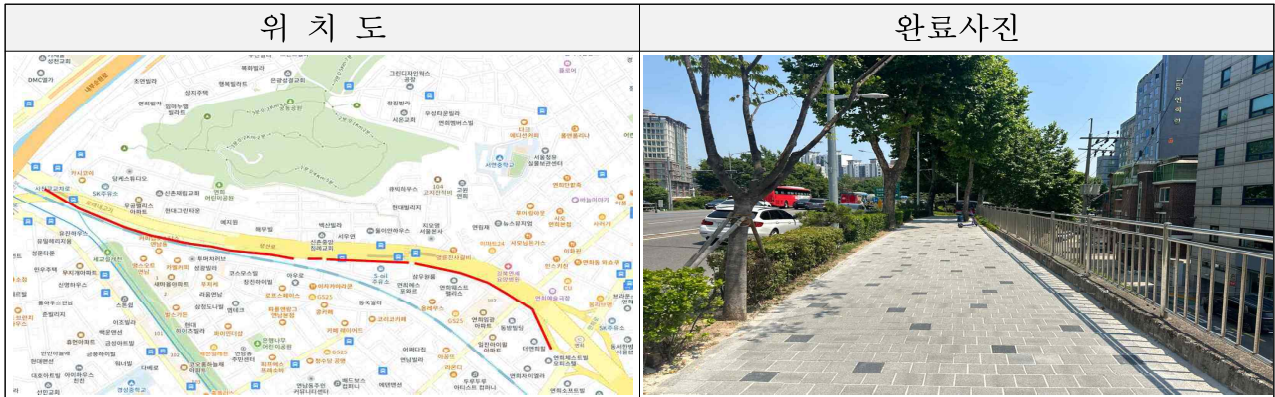

【통일로 독립공원 주변 노후보도 정비공사】

○ 사업개요

- 위 치 : 독립공원 교차로 ~ 독립문역 5번 출구
- 사업규모
 - 보도정비 10.5a, 측구 및 경계석 정비 300m 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 7.

○ 추진현황

- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 4. ~ 6. : 공사완료

※ 2024년 관내 보도 유지보수공사(연간단가) 연계 시행

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	500,000	437,130	87.43	

○ 위치도 및 완료사진



【한성과학고등학교 일대 노후보도 정비공사】

○ 사업개요

- 위 치 : 현저동 산 5-5 ~ 현저동 101-316
- 사업규모
 - 보도정비 7a, 측구 및 경계석 정비 310m, 아스팔트포장 26a 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 7.

○ 추진현황


- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 6. : 공사시행
- 2024. 6. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	350,000	331,520	94.72	

○ 위치도 및 완료사진

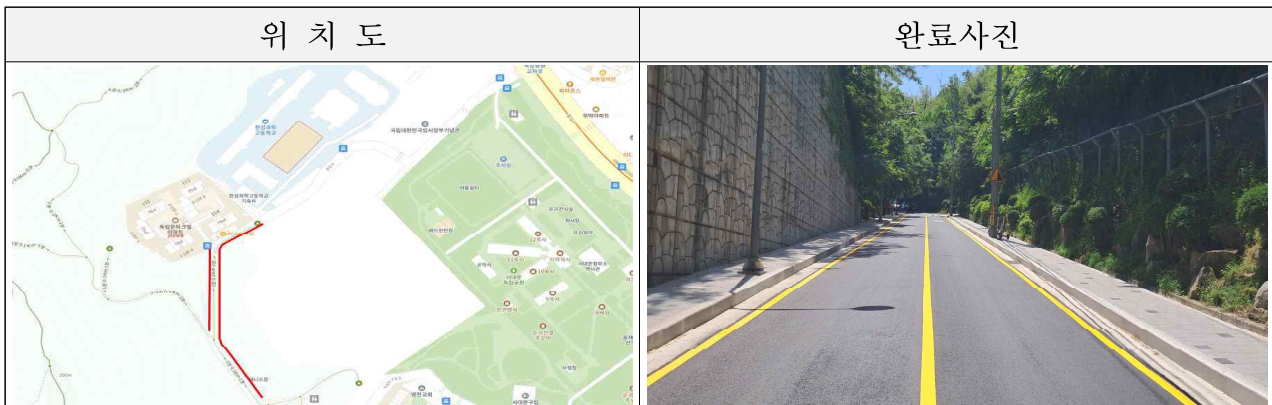

【증가로8길 도로구조 개선사업】

○ 사업개요

- 위 치 : 증가로 4길 59 ~ 증가로 8길 70
- 사업규모
 - 보도정비 3a, 측구 및 경계석 정비 300m, 아스팔트포장 7a 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 7.

○ 추진현황

- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 5. : 공사시행
- 2024. 6. 4. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	250,000	235,200	94.08	

○ 위치도 및 완료사진



3 북가좌사거리 일대 보행환경 개선사업 공모

○ 사업개요

- 위치 : 응암로 107 ~ 증가로 261
- 사업규모 : 보도포장 11a, 아스팔트포장 25a 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 주요 사업내용
 - ▶ 차도 축소 및 보도 확장(양방향 b=5m → b=7m)
 - ▶ 고원식 횡단보도 6개소, 횡단보도 경계석 정비 등 보행편의시설 설치
 - ▶ 한전주 및 통신주, 교통신호기 이설 등


○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. : 설계용역 발주
- 2024. 2. ~ 7. : 용역시행
- 2024. 8. : 시설공사 발주
- 2024. 9. ~ 12. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

○ 소요예산

- 총예산 : 650,000천원
- ▶ 시비 456,000천원, 구비 194,000천원('24년 추경예산 요청)

○ 위치도 및 현장사진

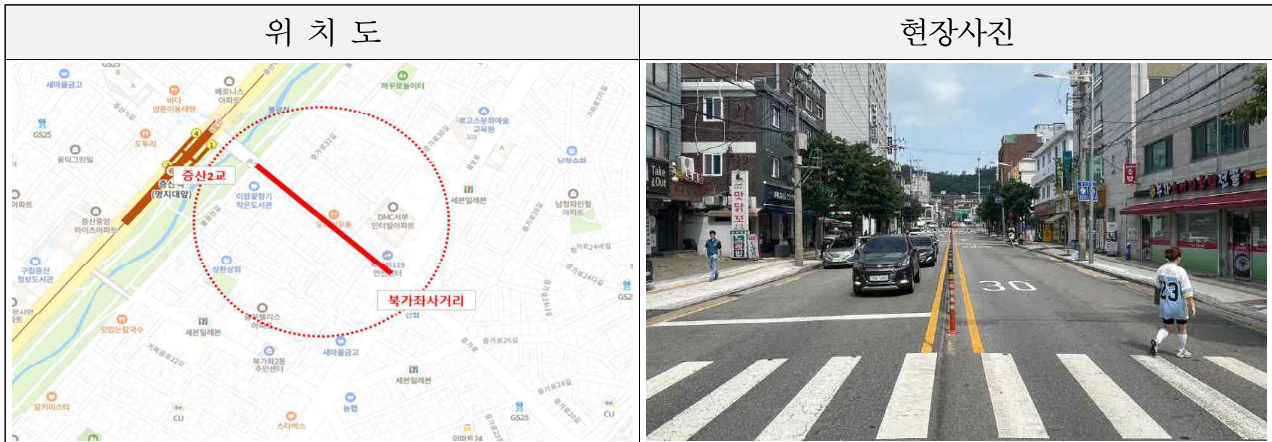

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	650,000	-	-	
시비	456,000	-	-	
구비	194,000	-	-	

소요예산(2024년 관내 보도유지보수공사(연간단가)외 5개 사업) (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	4,256,000	2,062,594	48.46	
시비	2,112,000	886,874	41.99	
구비	2,144,000	1,175,720	54.84	

기대효과

- 보행 장애 위험요소 해소로 각종 안전사고 예방
- 쾌적한 보행환경 조성 및 도시미관 개선

7	도로굴착복구 및 불량맨홀 정비사업	계속
----------	---------------------------	-----------

도로과	도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로굴착팀장: 고진성 ☎1769 담당: 김범진, 고나운 ☎1771, 1747
------------	--

굴착된 도로의 신속한 원상복구와 사후관리를 통해 원활한 도로기능을 유지하고, 불량맨홀을 적기에 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

사업개요

○ 사업목적

- 굴착된 도로의 신속한 원상복구 및 사후관리
- 침하, 주변파손 등이 발생한 불량맨홀의 적기 정비

○ 위 치 : 서대문구 관내

○ 기 간 : 2024. 3. ~ 12. 31.

○ 총사업비 : 947,419천원

- 기금 845,113천원(도로굴착복구), 구비 102,306천원(불량맨홀정비)

추진실적 및 목표

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 도로굴착복구공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 불량맨홀정비공사(연간단가)	건	1	1	1	1

[2024년 주요 추진실적]

① 도로굴착복구공사(연간단가) 계속

○ 사업개요

- 위 치 : 서대문구 관내
- 사업규모
 - 아스팔트포장 복구 및 정비 59a, 고압블록포장 12.2a 등
- 사업기간 : 2024. 3. 8. ~ 12. 31.

○ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 3. 8. : 공사착공
- 2024. 3. 19. ~ 6. 7. : 제1~3차 작업완료(공정율 : 30%)
- 2024. 7. ~ 12. 31. : 공사시행 및 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	845,113	268,950	31.8	
기금	845,113	268,950	31.8	

② 불량맨홀 정비공사(연간단가) 계속

○ 사업개요

- 위 치 : 서대문구 관내
- 사업규모 : 불량맨홀정비 63개소
- 사업기간 : 2024. 5. 10. ~ 12. 31.

○ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 5. 10. : 공사착공
- 2024. 5. 16. ~ 5. 31. : 제1차 작업완료(공정율 : 20%)
- 2024. 7 ~ 12.31. : 공사시행 및 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	102,306	-	-	
구비	102,306	-	-	

소요예산(2024년 관내 도로굴착복구공사(연간단가)외 1개 사업) (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	947,419	268,950	28.4	
기금	845,113	268,950	31.8	
구비	102,306	-	-	

기대효과

- 굴착된 도로의 신속한 원상복구 및 사후관리로 안전하고 쾌적한 도로유지 및 관리
- 도로상 설치된 불량맨홀 적기 정비를 통해 안전사고 예방 및 도로환경 개선

8**세검정로1길 보행자우선도로 조성****공모****도로과**

도로과장 : 최중구 ☎330-1758 교통시설팀장 : 조승현 ☎1812 담당 : 김혜지 ☎1870

보·차도가 미분리된 어린이보호구역 주변 이면도로인 세검정로1길을 보행자우선도로로 지정하여 어린이 보호 강화 및 보행환경을 개선하고자 함.

 사업개요

- 위 치 : 서대문구 세검정로1길(홍은중앙로 55~세검정로1길96)
- 규 모 : 도로 폭 6~12m, 길이 175m
- 사업내용
 - 아스콘 포장 및 디자인포장, 교통안전표지, 노면표시
 - 태양광 LED표지병, 보행자우선도로 안내표지판 등 각종 교통안전시설
- 사업기간 : 2024. 04. ~ 10.
- 총사업비 : 120,000천원
 - 국비 60,000천원, 구비 60,000천원
- 지정현황 : 13개 구간 2.7km (2015년~2023년)

 **추진현황**

- 2024. 01. 05. : 보행자우선도로 행정안전부 공모서 제출
- 2024. 03. 26. : 보행자우선도로 공모 선정
- 2024. 05. 28. : 국비 확보(60,000천원)

향후계획

- 2024. 06. ~ 07. : 주민협의체 구성 및 간담회
- 2024. 07. : 세검정로1길 보행자우선도로 지정 고시
- 2024. 07. : 공사준비
- 2024. 08. ~ 10. : 공사 착공 및 준공



기대효과

- 보행자우선도로 조성을 통한 어린이 보호 강화 및 보행자 안전성 증진

9

대중교통 편의제공을 위한 스마트쉼터 확대 설치

신규

도로과

도로과장 : 최중구 ☎330-1758 교통시설팀장 : 조승현 ☎1812 담당 : 유영산 ☎1797

버스정류소 편의시설인 스마트쉼터를 확대 설치하여 주민편의 증진 및 대중교통서비스 개선으로 대중이용활성화에 기여


사업개요

- 기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대상 : 3개소(가로변 시내버스정류소)

구분	당초(4개소)	변경(3개소)	비고
대상지점	서대문우체국, 충정로역 2호선, 동신병원, DMC 래미안e편한세상2.4단지	동신병원, DMC래미안 e편한세상2,4단지, 신촌기차역	

※ 변경사유: 전기수용에 어려움, 기 설치된 승차대의 광고판 가림에 따른 설치자체 요청(서울시)

○ 위치도 및 현장사진

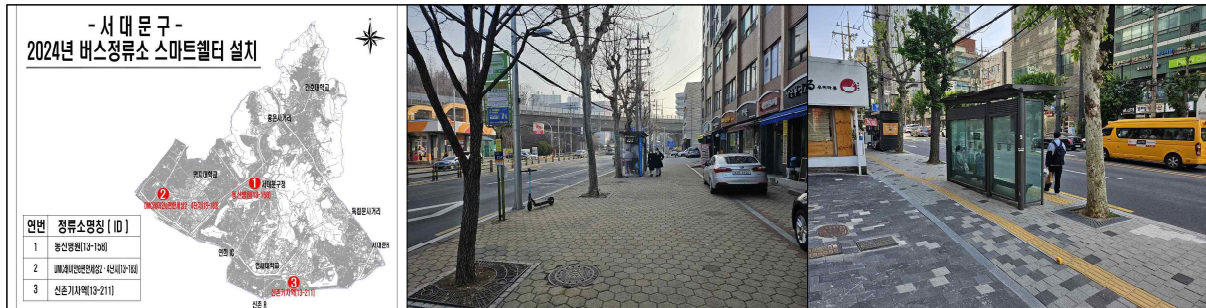

○ 주요기능

- 자동문, 냉·난방기, 디지털사이니지, 미세먼지 내·외부 센서, 환기·청정·살균시스템, 무선충전기, CCTV, 버스도착알리미 등
- 내부 설정온도에 따라 냉·난방기 자동작동 되며 긴급상황발생 시나 필요에 따라 원격제어 가능

○ 총사업비 : 210,000천원 (구비)

추진현황 및 목표(2024. 6. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 스마트쉘터 확대 설치	개소	-	6	-	3

추진현황

- 2024. 1. ~ 2. : 현장조사 및 대상지점 선정 (4개소)
- 2024. 3. ~ 4. : 계획수립 및 공사발주 준비
- 2024. 5. ~ 6. : 대상지점 재조사 및 선정 (3개소)

소요예산

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	210,000	-	-	전액구비

향후계획

- 2024. 6. ~ 7. : 관계부서 협의 및 각종 심의(도로점용, 디자인 등)
- 2024. 7. ~ 8. : 공사 발주
- 2024. 9. ~11. : 제작 및 설치·운영

기대효과

- 대중교통 이용주민 편의제공으로 대중교통이용활성화 기대
- 스마트쉘터 설치에 따른 대중교통서비스 향상으로 주민만족도 증가

10	가로변 마을버스정류소 온열의자 확대 설치	신규
-----------	-------------------------------	-----------

도로과	도로과장: 최종구 ☎330-1758 교통시설팀장: 조승현 ☎1812 담당: 유영산 ☎1797
------------	---

버스승차대 설치가 어려운 마을버스정류소에 온열의자를 설치하여 민원 사항 해소 및 주민편의 증진으로 대중교통이용 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 12.
- 대 상 : 100개소(마을버스정류소 총 282개소)
 ※승차대 미 설치 정류소를 포함하여 선정
- 총 사업비 : 400,000천원 (시비)

추진현황 및 목표

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 마을버스 정류소 온열의자 확대 설치	개소	5	1	-	100

추진현황

- 2024. 5. ~ 8. : 설치대상 지점 전수조사 및 확정

소요예산

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	400,000	-	-	전액시비

향후계획

- 2024. 8. ~ 9. : 계획수립 및 관계부서 협의, 공사발주
- 2024.10. ~11. : 제작 및 설치·운영

기대효과

- 대중교통 이용주민 편의제공으로 대중교통이용활성화 기대
- 온열의자 설치에 따른 대중교통서비스 향상으로 주민만족도 증가

설치현황 사진



도로과

도로과장: 최종구 ☎330-1758 지하안전팀장: 이석중 ☎8594 담당: 최수형, 박한솔 ☎1772, 1969

지하를 안전하게 개발하기 위한 안전관리체계를 확립하고, 공동탐사 및 분석을 통하여 도로함몰·지반침하 등 안전사고를 사전에 예방하고 안전한 도로환경을 조성하고자 함.

 사업개요

○ 사업목적

- 지하시설물 주변 지반 및 지하 개발 공사장 주변 안전점검
- 공동탐사 및 분석을 통한 도로함몰·지반침하 등 안전사고 사전예방

○ 위 치 : 서대문구 관내

○ 총사업비 : 346,730천원

- 시비 45,000천원, 구비 301,730천원

 추진현황 및 목표 (2024. 6. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 지하안전관리	건	1	1	1	1
◦ 관내 도로(보도) 지하 공동탐사 용역	건	0	1	1	1
◦ 지반침하 우려구간 공동조사(특별점검) 용역	건	0	0	1	1

【 2024년 주요 추진현황 】
1] 지하안전관리 계속

○ 사업개요

- 위 치 : 서대문구 관내
- 매년 2월말까지 지하안전관리계획 수립
- 지하개발공사장 안전점검 실시(굴착깊이 10m 이상)
- 지하안전평가서 검토(굴착깊이 10m 이상)
- 지하시설물 안전관리규정 심사
- 유관기관 협의체 구성 및 운영

○ 추진현황

- 2024.02. : 지하안전관리계획 수립
- 2024.03. : 해빙기 지하시설물 및 지하개발사업장 안전점검
- 2024.03. : 지하안전관리 유관기관(부서) 교육
- 2024.06. : 서대문구 지하안전위원회 위원 위촉
- 2024.06. : 우기 지하시설물 및 지하개발사업장 안전점검
- 2024.02. ~ 06. : 지하안전관리규정 심사

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,730	864	49.9	전액 구비

② 관내 도로(보도) 지하 공동탐사 용역 계속

○ 용역개요

- 대 상 지 : 서대문구 관내 도로(보도) 99km
 - ▶ 홍은1·2동, 홍제2동, 북가좌1·2동, 남가좌1·2동
- 과업내용
 - ▶ 1차 탐사(보도형 멀티형 GPR - 공동탐지) : 연장 99km,
 - ▶ 2차 조사(천공 및 내시경 조사) : 32개소(목표공동)
 - ▶ 공동신속복구(친환경 유동성채움재) : 29개소
- 용역기간 : 2024.06. ~ 12.

○ 추진현황

- 2024.02. : 용역 시행
- 2024.06. : 용역 계약 및 착수

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	255,000	0	0	전액 구비

3 지반침하 우려구간 공동조사(특별점검) 용역 신규

○ 용역개요

- 대상지 : 서대문구 관내 도로(구도) 및 지하개발사업현장
 - ▶ 연장 32km(차도 9.6km, 보도 1km 3회 반복)
- 과업내용
 - ▶ 1차 탐사(GPR - 공동탐지) : 연장 32km (차도 9.6km, 보도 1km 3회반복)
 - ▶ 2차 조사(천공 및 내시경 조사) : 10개소(목표공동)
 - ▶ 공동신속복구(친환경 유동성채움재) : 9개소
- 용역기간 : 2024.06. ~ 12.

○ 추진현황

- 2024.05. : 용역 시행
- 2024.06. : 용역 계약 및 착수

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	90,000	0	0	
시비	45,000	0	0	재난안전정책과 예산
구비	45,000	0	0	재난안전과 예산

소요예산(지하안전관리 외 2개 사업)

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	346,730	864	0.2	
시비	45,000	0	0	
구비	301,730	864	0.3	

□ 향후계획

① 지하안전관리 계속

- 2024. 7. ~ 12. : 지하안전관리규정 심사
- 2024. 7. ~ 12. : 유관기관 협의체 운영

② 관내 도로(보도) 지하 공동탐사 용역 계속

- 2024. 8. ~ 9. : GPR 탐사 및 데이터 분석
- 2024. 10. ~ 11. : 2차 조사 및 공동 신속복구
- 2024. 12. : 용역 준공

③ 지반침하 우려구간 공동조사(특별점검) 용역 신규

- 2024. 7. ~ 10. : GPR 탐사 및 데이터 분석
- 2024. 11. : 2차 조사 및 공동 신속복구
- 2024. 12. : 용역 준공

□ 기대효과

- 지하안전 확보 및 지하개발공사장 안전사고 예방
- 관내 도로 지하 공동탐사를 통한 도로 공동의 원인을 제거하여 안전한 도로환경 조성

12	가로등·보안등 보수 및 개량사업	계속
-----------	--------------------------	-----------

도로과	도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로조명팀장: 소해준 ☎1980 담당: 임현우, 장민정 ☎1981, 1763
------------	--

도로조명시설 고장 시 신속한 보수 및 노후·불량시설 정비로 전기안전 사고 예방과 야간 이용주민들에게 쾌적하고 안전한 도로 환경 제공

사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용
 - 가로등·보안등 부점등 등 고장시설물에 대한 신속 유지보수
 - 노후·불량 도로조명 시설물을 고효율 LED등기구로 개량
- 사업규모
 - 가로등 : 연희로 외 54개 노선, 6,015등

구 분	총 계	세부시설현황			분전반
		차도등	보행등	기타 (육교등, 교량하부등)	
총 계	6,015	3,813	2,111	71	217
시 도	3,720	2,323	1,326	71	122
구 도	2,295	1,495	800	-	95

- 보안등 : 14개동, 9,461등

구 분	총 계	세부시설현황				비 고
		전용주	한전주	통신주	벽부등 (건축물)	
총 계	9,461	1,090	4,567	610	3,194	14개동

○ 총사업비 : 804,000천원(구비)

추진현황 및 목표

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
가로등 유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
보안등 유지보수공사(연간단가)	건	2	2	2	2
에너지절약 보안등 개량공사(연간단가)	건	1	1	1	1

【 2024년 주요 추진현황 】

① 가로등 유지보수공사(연간단가) 계속

○ 사업개요

- 위 치 : 서대문 관내
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업규모 : 가로등 6,015등 유지보수 및 민원처리 등

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. 1. : 공사시행
- 2024. 12. 31. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	136,000	0	0	
구비	136,000	0	0	

② 보안등 유지보수공사(연간단가) 계속

[2024년 주택가 좋은빛환경 조성 보안등 보수공사(연간단가-1구역)]

○ 사업개요

- 위 치 : 홍제1동 외 8개동
(홍제1·2·3동, 홍은1·2동, 남가좌1·2동, 북가좌1·2동)
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업규모 : 보안등 5,006등 유지보수 및 민원처리 등

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. 1. : 공사시행
- 2024. 12. 31. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	136,000	38,147	28.1	
구비	136,000	38,147	28.1	

[2024년 주택가 좋은빛환경 조성 보안등 보수공사(연간단가-2구역)]

○ 사업개요

- 위 치 : 연희동 외 4개동(연희동, 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동)
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업규모 : 보안등 4,455등 유지보수 및 민원처리 등

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. 1. : 공사시행
- 2024. 12. 31. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	126,000	42,385	33.6	
구비	126,000	42,385	33.6	

③ 에너지절약 보안등 개량공사(연간단가)

계속

○ 사업개요

- 위 치 : 서대문구 관내
- 사업내용 : 2024. 2. ~ 2024. 12.
- 사업규모 : LED 보안등 350등 신설 및 개량
- 사업기간 : 2024. 2. ~ 2024. 12.

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 사업계획 수립 및 설계
- 2024. 3. : 공사발주
- 2024. 4. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	406,000	203,897	50.2	
구비	406,000	203,897	50.2	

총 소요예산(가로등 유지보수공사 외 2건)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	804,000	284,429	35.4	
구비	804,000	284,429	35.4	

기대효과

- 노후된 등기구를 교체하여 전기안전사고 예방 등 안전한 밤거리 조성
- 고효율·저소비 LED 등기구 교체로 도시미관 제고 및 에너지 절감 기여

13	범죄사각지대 해소를 위한 안산산책로 보안등 설치사업	신규
-----------	---	-----------

도로과

도로과장: 최중구 ☎330-1758 도로조명팀장: 소해준 ☎1980 담당: 김재형 ☎1982

최근 발생되는 무차별 범죄로 구민들의 불안감이 높아지고 있어, 안산산책로 등 우범지역에 스마트보안등(CCTV) 및 비상벨을 설치하여 주민 불안 해소 및 안전한 보행환경을 제공코자 함

사업개요

- 사업위치 : 안산산책로 (연희로32길 90 ~ 연희동 산2-17)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.
- 사업규모 : 보안등 27개소 및 비상벨(관제용 CCTV 포함) 4개소 설치
- 사업내용 : 노후된 기존 보안등 철거 및 비상벨 연계한 스마트보안등 설치
- 총사업비 : 246,000천원(구비)

추진현황 및 목표

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 스마트보안등 설치	개소	-	-	27	27
◦ 비상벨 설치(관제용 CCTV 포함)	개소	-	-	4	4

○ **추진현황**

- 2024. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
- 2024. 3. : 사업계획 변경
- 2024. 4. : 공사시행(전기, 통신)
- 2024. 6. : 공사준공

○ **소요예산 및 집행현황**

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	246,000	226,657	92.1	
구비	246,000	226,657	92.1	

□ 기대효과

- 등산로 이용 주민들에게 밝은 보행환경 조성 및 실시간 CCTV 촬영을 통해 안전사각지대 해소 및 무차별범죄 사전 예방
- 관제센터 모니터링이 가능한 비상벨 설치 등 치안 인프라 개선으로 범죄 사각지대 및 주민 불안감 해소

□ 위치도 및 현장사진



14	서대문 명소 홍보조명 설치 사업	신규
-----------	--------------------------	-----------

도로과	도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로조명팀장: 소해준 ☎1980 담당: 임현우, 장민정 ☎1982, 1763
------------	--

서대문 명소인 『홍제천 인공폭포』 및 『무악재 하늘다리』를 위한 홍보조명을 설치하여 야간 볼거리 제공 및 이용자 활성화를 제고코자 함

사업개요

- 사업위치 : 서대문구 관내
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 10.
- 사업규모
 - 홍제천 인공폭포 홍보조명 2개소 설치
 - 무악재 하늘다리 홍보조명 2개소 설치
- 사업내용 : 홍보조명 설치를 통한 서대문구 명소 홍보효과 제고
- 총사업비 : 230,000천원(구비)

추진현황 및 목표

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
○ 홍제천 인공폭포 홍보조명 설치	개소	-	-	-	2
○ 무악재 하늘다리 홍보조명 설치	개소	-	-	2	2

[2024년 주요 추진현황]

① 서대문구 홍제천 인공폭포 홍보조명 설치 신규

- 사업개요
 - 사업기간 : 2024. 3. 1. ~ 2024. 10. 31.
 - 사업위치 : 홍제천 홍연교 내
 - 사업내용 : 홍제천 인공폭포 활성화 조형물(경관조명 등) 설치
 - 사업비 : 150,000천원(구비)
- 추진현황 및 향후계획
 - 2024. 3. : 디자인 기본계획 수립(도시관리과)
 - 2024. 4. : 도로시설물 사용 관련 유관기관 협의(서부도로사업소)

- 2024. 6. : 디자인 설계용역 시행
- 2024. 8. : 공사시행
- 2024. 10. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	150,000	0	0	
구비	150,000	0	0	

○ 위치도 및 현장사진



2 무악재 하늘다리 홍보조명 설치 신규

○ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.
- 사업위치 : 서대문구 현저동 1-150
- 사업내용 : 무악재 하늘다리 홍보조명 2개소 설치 등
- 공 사 비 : 80,000천원(구비)

○ 추진현황


- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 2. : 실시설계용역 시행
- 2024. 3. : 공사시행
- 2024. 5. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	80,000	69,920	87.4	
구비	80,000	69,920	87.4	

○ 위치도 및 현장사진

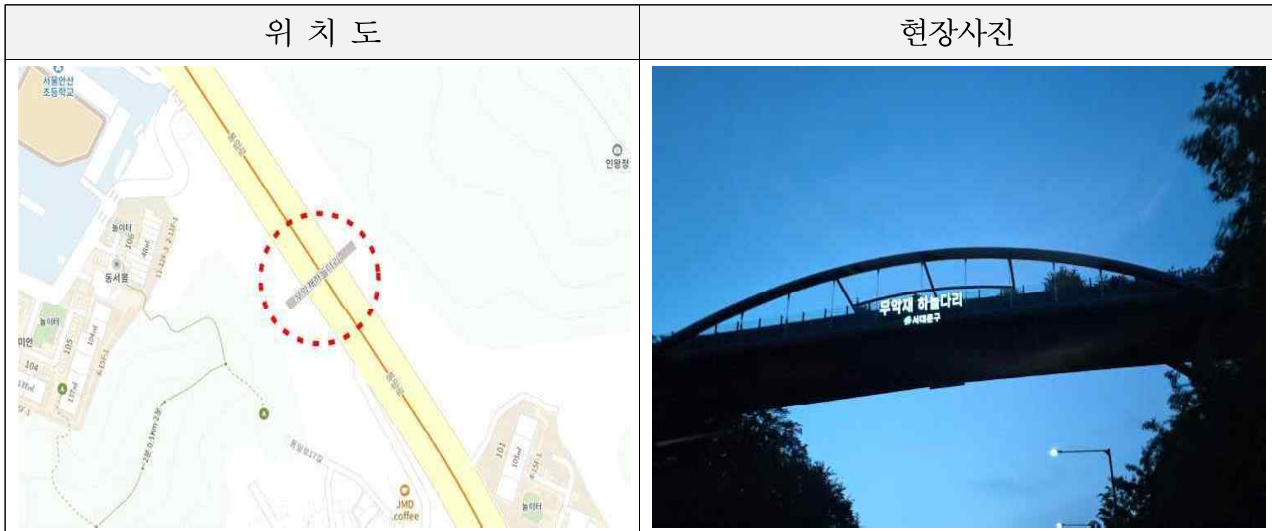

총 소요예산(홍제천 인공폭포 홍보조명+무악재 하늘다리 홍보조명)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	230,000	69,920	30.4	
구비	230,000	69,920	30.4	

기대효과

- 홍연교 이용 차량 및 주민들에게 명승지 홍제천 인공폭포 및 명승지 폭포마당 홍보
- 홍보조명을 설치하여 새로운 이정표(만남의 장소로 활용 등) 탄생으로 서대문구 홍보효과 극대화
