

# 도 로 과



# 보고 순서

I . 일반현황 .....	59
II . 2024년 주요업무 추진실적	
1. 북아현 재정비촉진구역 내 과선교 설치공사 .....	61
2. 독립문 문화공원 지하공영주차장 조성 .....	63
3. 도로개설 사업 .....	65
4. 도로 및 도로시설물 정비사업 .....	72
5. 겨울철 제설대책 추진사업 .....	79
6. 보도 및 보도시설물 정비사업 .....	85
7. 도로굴착복구 및 불량맨홀 정비사업 .....	91
8. 세검정로1길 보행자우선도로 조성 .....	93
9. 대중교통 편의제공을 위한 스마트쉼터 확대 설치 .....	95
10. 가로변 마을버스정류소 온열의자 확대 설치 .....	97
11. 지하안전 관리 및 관내 공동탐사 용역 .....	99
12. 가로등·보안등 보수 및 개량사업 .....	103
13. 범죄사각지대 해소를 위한 안산산책로 보안등 설치사업 ...	107
14. 서대문 명소 홍보조명 설치 사업 .....	109



# I. 일반 현황

## 1. 직원현황(2024. 10. 15. 기준)

(단위 : 명 / 괄호안 성비)

구 분	계	일반직									별정직
		행정직 + 기술직						관리 운영직	전문 경력관	임기제	
		소계	5급	6급	7급	8급	9급				
정 원	36	32	1	7	13	5	6	-	-	4	-
현 원	35 (26/9)	31 (23/8)	1 (1/0)	7 (7/0)	12 (9/3)	6 (3/3)	5 (3/2)	-	-	4 (3/1)	-
과부족	△1	△1	-	-	△1	1	△1	-	-	-	-

## 2. 팀별 업무분장

팀 별	분 장 업 무
도 로 계 획	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로 및 토목공사 계획수립 및 집행</li> <li>도시계획시설(도로) 시행인가, 공사설계 및 감독</li> <li>비관리청 도로시설공사의 허가</li> </ul>
도 로 관 리	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로 및 도로시설물 유지관리 보수</li> <li>지하보도 관리</li> <li>제설작업의 계획 및 실시</li> </ul>
보 도 관 리	<ul style="list-style-type: none"> <li>보도유지관리 및 보도점검·보수 사업</li> <li>보도환경순찰 및 민원처리 업무</li> <li>보도대장 관리 및 보도 통계 업무</li> </ul>
도 로 굴 착	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로굴착복구사업 관리 및 승인</li> <li>불량맨홀 정비사업 관련 업무</li> </ul>
교 통 시 설	<ul style="list-style-type: none"> <li>대중교통 시설관리 업무</li> <li>교통체계 개선 및 교통안전시설물 설치 및 관리</li> <li>자전거이용활성화 증진 사업 및 어린이·노인보호구역 개선 사업</li> </ul>
지 하 안 전	<ul style="list-style-type: none"> <li>지하안전관리 계획수립 및 지하안전평가 승인 관련업무</li> <li>안전관리규정 심사 및 지하시설물 안전관리 실태 점검</li> <li>지반침하위험도평가(공동탐사 용역) 및 중점관리대상 지정</li> </ul>
도 로 조 명	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로조명(기전)시설 유지관리</li> <li>도로조명시설의 공사계획 및 집행</li> <li>도로조명시설 설계 시공 및 감독</li> </ul>

### 3. 기반시설

#### ○ 도로

도로율	도로연장	도로면적	포장율	포장연장	포장면적	보도면적
17.25%	311km	2,744km <sup>2</sup>	100%	311km	2,744km <sup>2</sup>	0.283km <sup>2</sup>

※ 서울시 평균 도로율 : 23.20%

#### ○ 폭원별 도로 분류

구분	폭원(m)	도 로			포 장	
		연장(m)	면적(m <sup>2</sup> )	비율(%)	연장(m)	면적(m <sup>2</sup> )
계		311,206	2,744,932	100	311,206	2,744,932
광로	40이상	5,917	236,870	8.6	5,917	236,870
대로	25~40미만	28,429	801,493	29.2	28,429	801,493
중로	12~25미만	24,288	405,117	14.8	24,288	405,117
소로	4~12미만	252,572	1,218,050	44.4	252,572	1,218,050
광장	4개소		83,402	3.0		83,402

### 4. 도로 시설물 현황

(단위 : 개소)

구분	계	교량	보도육교	지하보도	입체교차로	차도육교	터널	굴다리	고가차도	옹벽석축	지하차도	가로등	보안등	보도육교승강기
계	16,980	23	7	2	1	2	1	1	4	29	3	7,444	9,461	2
구청	15,534	15	7	2	-	2	-	1	-	29	-	6,015	9,461	2
서부도로사업소	1,446	8	-	-	1	-	1	-	4	0	3	1,429	-	

### 5. 보유장비 현황

(단위 : 대)

계	제설차	덤프트럭	제설삽날	염화칼슘살포기	카타기	지게차	로더
44	1	3	6	30	1	1	2

### 6. 버스정류소

(단위 : 개소)

계(개소)	간선	지선	간·지선	광역	중앙	공항	마을버스	기타(시외)
549	8	78	75	1	48	40	298	1

## II. 2024년 주요업무 추진실적

<b>1</b>	<b>북아현 재정비촉진구역 내 과선교 설치공사</b>	<b>계속</b>
----------	-------------------------------	-----------

### 도로과

도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로계획팀장: 정기찬 ☎1759 담당: 김대호 ☎1770

경의·중앙선 횡단으로 단절된 북아현1-1구역과 1-2구역 간 도로교 및 녹지교를 설치하여 지역주민 불편 해소와 휴식공간을 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 서대문구 북아현동 1011-10번지 일대
- 규 모 : 도로교 B=20m, L=52m, 녹지교 B=29m, L=42m  
연결도로 개설 L=255m, B=12~20m
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2025. 2. (2025. 4. 준공기한 연장 예정)
- 사업내용 : 경의·중앙선 상부 횡단 도로교 및 녹지교 설치
- 총사업비 : 17,000,000천원(민간 예치금)

### □ 추진현황

- 2023. 02. : 시설공사 착공 및 감리 착수
- 2024. 01. : (힐스테이트 측) 도로교 및 녹지교 교대 설치 완료
- 2024. 06. : 도로교 거더 7본 공장제작 완료
- 2024. 08. : (힐스테이트 측) 임시도로 2개소 운영
- 2024. 09. : (푸르지오 측) 도로교 교대, 녹지교 교각 설치 완료
- 2024. 10. : (힐스테이트 측) 연결도로 성토 및 거더조립장 설치 완료

### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	17,000,000	11,206,544	65.9	
기타	17,000,000	11,206,544	65.9	예치금, 지하보행 네트워크 기금

향후계획

- 2024. 11. ~ 12. : 도로교 거더 및 상부구조물 설치
- 2025. 01. ~ 03. : 녹지교 거더 및 상부구조물 설치
- 2025. 04. : 공사 준공(예정)

위치도 및 조감도



<b>2</b>	<b>독립문 문화공원 지하공영주차장 조성</b>	<b>계속</b>
----------	----------------------------	-----------

**도로과** 도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로계획팀장: 정기찬 ☎1759 담당: 여수현 ☎8020

독립문 문화공원 리모델링 및 지하주차장 조성을 통해 주변경관 개선에 기여하고 영천시장 방문객과 지역주민에게 주차편의를 제공

**사업개요**

- 위 치 : 서대문구 영천동 263 일대
- 규 모 : 지하1층 ~ 지하3층, 연면적 6,080.88㎡, 120면
- 사업기간 : 2021. 12. ~ 2024. 10. (2025. 3. 사업기간 연장 예정)
- 사업내용 : 지하주차장 건립, 공원 리모델링
- 총사업비 : 33,080,000천원
  - 국비 7,200,000천원, 시비 5,040,000천원, 구비 10,960,000천원, 특교금 9,880,000천원

**추진현황**

- 2021. 12. : 공사 착공
- 2022. 03. ~ 11. : 지장물 철거 및 RPP 방음벽 시공, CIP 천공
- 2022. 12. ~ 2024. 02. : 가시설, 토공(기초) 공사 완료
- 2024. 02. ~ 10. : 건축 골조 작업 진행


○ **소요예산 및 집행현황** (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	33,080,000	22,557,684	68.3	
국 비	7,200,000	7,200,000	100	
시 비	5,040,000	5,040,000	100	
구 비	10,960,000	2,930,049	26.7	
특교금	9,880,000	7,387,635	74.8	

**향후계획**

- 2024. 07. ~ 2025. 03. : 소방, 통신, 전기 공사
- 2024. 07. ~ 2025. 03. : 건축, 기계설비 공사
- 2024. 07. ~ 2025. 03. : 엘리베이터 설치 및 상부 조정공사
- 2024. 03. : 건설공사 준공
- 2025. 04. : 공영주차장 운영

**위치도 및 조감도**

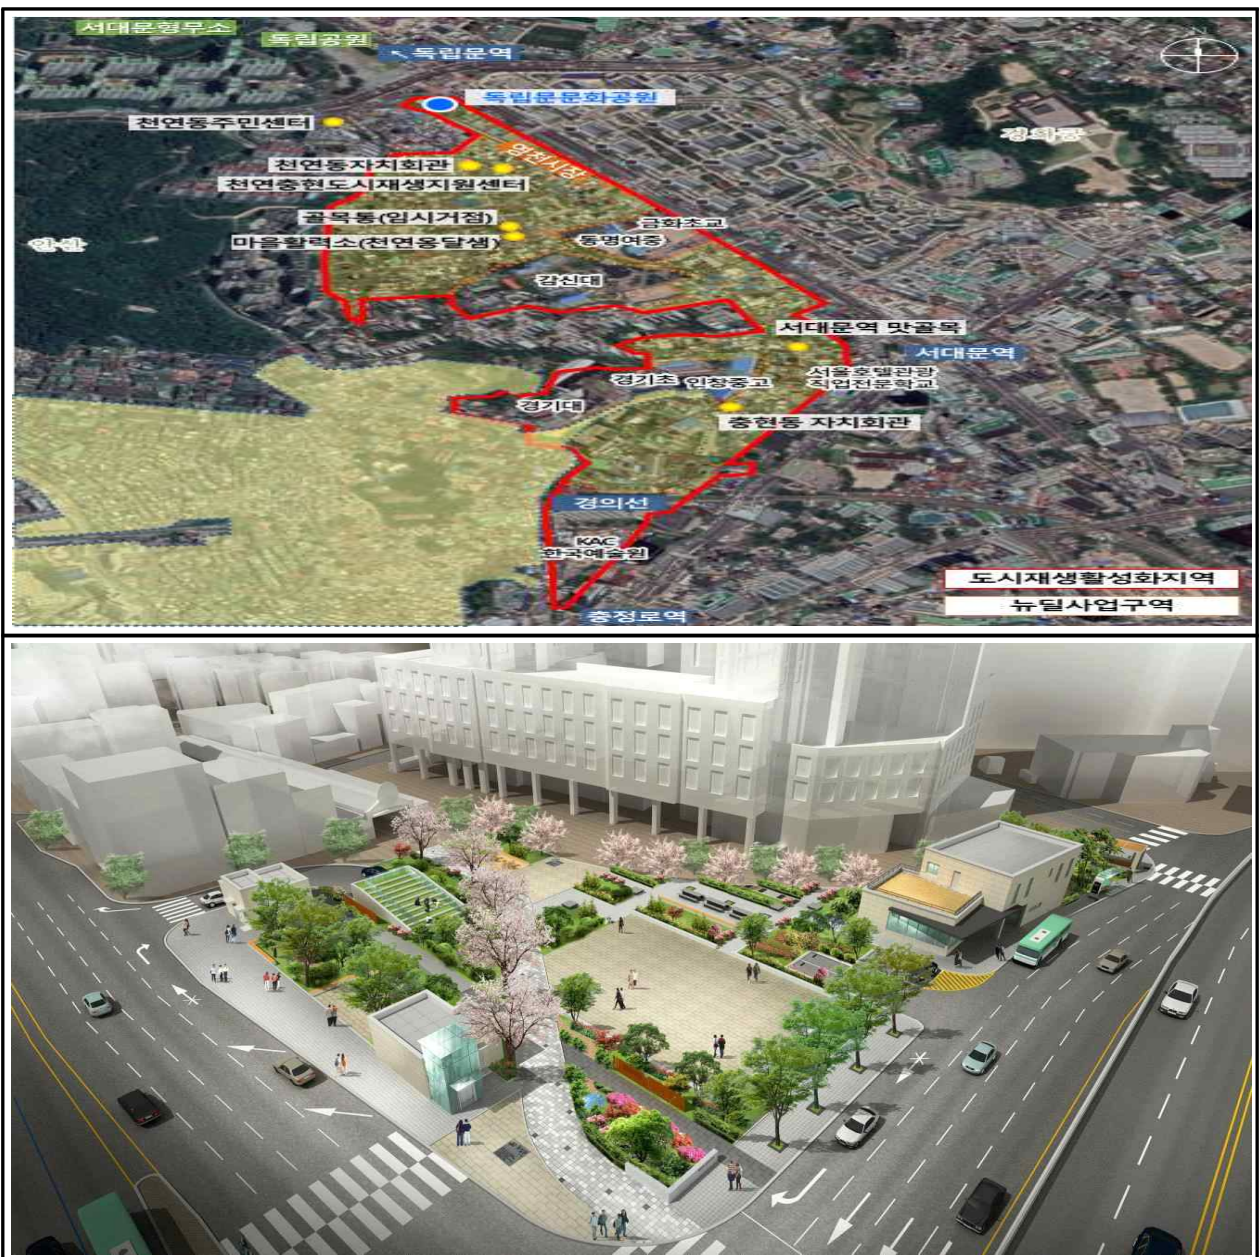

<b>3</b>	<b>도로개설 사업</b>	<b>신규 · 계속</b>
----------	----------------	----------------

<b>도로과</b>	도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로계획팀장: 정기찬 ☎1759 담당 : 임승재, 김희연 ☎1762,1764
------------	----------------------------------------------------------------

관내 도로개설 사업을 통하여 지역주민 교통 불편 해소 및 쾌적한 도로환경을 개선하고, 장기미집행 도시계획시설(도로)사업의 집행으로 사유재산권 보호와 도시계획시설 실효를 해소하고자 함

**사업개요**

○ **추진방향**

- 도로개설 사업을 통하여 교통 불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성
- 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업의 집행으로 사유재산권 보호와 도시계획시설 실효 해소

○ **총사업비 : 10,345,892천원**

- 시비 2,261,008천원, 구비 8,084,884천원

**추진현황 및 목표(2024. 10. 15. 기준)**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 도로개설 사업	건	1	2	4	4
◦ 장기미집행 도시계획(도로)시설 개설	건	4	1	1	1

**[ 2024년 주요 추진현황 ]**

**1 도로개설 사업** 신규 계속

○ **신촌동 금화터널 인근 도로개설 공사**

- 사업개요

▸ 위치 : 이화여대 산학협력관 ~ 신촌동 1-9(봉원사 2길)

▸ 사업규모

(신설)봉원동 45-1 ~ 봉원동 1-37 : B=9.0m, L=92m

(확장)신촌동 1-52 ~ 봉원동 41-6 : B=6.0m, L=175m

▸ 사업기간 : 2022년 9월 ~ 2025년 12월

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2022. 8. : 사업추진 계획 수립
- ▶ 2022. 12. ~ '23. 3. : 타당성 용역 시행
- ▶ 2023. 3. ~ '24. 1. : 도시계획시설(도로) 결정, 실시계획 작성을 위한 열람 공고 및 중토위 사업인정 협의 실시
- ▶ 2023. 11. : 기본 및 실시설계용역 시행 및 착수
- ▶ 2024. 01. : 도로 노선 측량(중심선, 종·횡단) 및 지반 조사 실시
- ▶ 2024. 01. : 도시계획시설(도로) 실시계획 작성 고시
- ▶ 2024. 01. ~ 2025.05. : 손실보상 시행 및 완료
- ▶ 2024. 08. : 기본 및 실시설계 완료
- ▶ 2024. 10. : 도로개설공사 발주
- ▶ 2025. 12. : 도로개설공사 준공 및 도로개통

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	4,570,000	259,743	5.7	
구비	4,570,000	259,743	5.7	

□ 위치도 및 현장사진



○ 통일로20길 도로확장공사

- 사업개요

- ▶ 위치 : 서대문구 홍제동 40-248 ~ 40-274
- ▶ 사업규모 : 도로개설 (연장 210m, 폭 6~8m)  
건축물 해체 4개소 등
- ▶ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2024. 12.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2022. 12. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시
- ▶ 2023. 3. ~ 6. : 실시설계용역 시행
- ▶ 2023. 4. ~ 9. : 손실보상 협의
- ▶ 2023. 10. : 수용재결 시행
- ▶ 2023. 10. : 공사발주
- ▶ 2024. 5. ~ 12. : 공사시행 및 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	730,000	100,030	13.7	
시비	200,000	-	-	
구비	530,000	100,030	18.9	

□ 위치도 및 현장사진



○ **충정로3가 184-4 ~ 190-25간 도로개설공사**

- 사업개요

- ▶ 위 치 : 서대문구 충정로3가 184-4~190-25
- ▶ 사업규모 : 도로개설 (연장 189m, 폭 6m), 건축물 해체 3개소 등
- ▶ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2020. 6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획작성 고시
- ▶ 2021. 4. ~ 6. : 손실보상 협의 시행
- ▶ 2021. 9. ~ 12. : 실시설계용역 시행
- ▶ 2021. 12. ~ 2022. 11. : 공사 시행(1단계 구간)
- ▶ 2022. 11. : 공사발주(2단계 구간)
- ▶ 2023. 1. ~ 9. : 계고장 발송 및 변상금 부과(충정로7길 29-20)
- ▶ 2024. 4. : 토지 및 건축물 명도소송 제기(충정로7길 29-20)
- ▶ 2024. 5. ~ 6. : 우선 시행 추진구간 공사 시행 및 준공

○ **소요예산 및 집행현황**

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	757,000	742,243	98.1	
시비	-	-	-	
구비	757,000	742,243	98.1	

□ **위치도 및 현장사진**

위 치 도	현장사진

○ 연희로36~연희대우아파트 간 도로개설공사

- 사업개요

- ▶ 위 치 : 연희로 36 ~ 연희로 38-20
- ▶ 사업규모 : 보도정비 5a, 측구 및 경계석 정비 250m 등
- ▶ 사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 12.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2023. 2. : 공사 계약
- ▶ 2023. 3. ~ 2024. 10. : 공사중단(도로개설 반대민원으로 본 사업 미착공 및 사고이월)
- ▶ 2023. 10. ~ : 주민의견을 수렴하여 사업방향 결정

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	200,000	0	0	
구비	200,000	0	0	

위치도 및 현장사진



② 장기미집행(도로)사업 계속

○ 홍은2동 203-2~188-9간 도시계획시설(도로) 사업

- 사업개요

- ▶ 위 치 : 홍은2동 203-2~188-9
- ▶ 사업규모 : 연장 572m, 폭 6m
- ▶ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 12.

- 추진현황 및 향후계획

- ▶ 2020. 6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획작성 고시
- ▶ 2022. 4. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시
- ▶ 2023. 1. ~ 2023. 5. : 손실보상 협의 시행
- ▶ 2023. 11. : 수용재결
- ▶ 2024. 5. : 중토위 이의재결 완료 및 변경 고시
- ▶ 2024. 6. : 공탁 및 보상완료



※ 부당이득금 소송 패소(' 23.8.)에 따른 추가 보상 시행 중

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	4,088,892	2,062,846	50.5	
시비	2,061,008	2,061,008	100	
구비	2,027,884	1,838	0.09	

위치도 및 현장사진

위 치 도	현 장 사 진
	
<p>홍은2동 203-2~188-9간 도로개설 (연장 572m, 폭 6m)</p>	

**소요예산(도로개설사업 + 장기미집행(도로)사업)**

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	10,345,892	3,164,862	30.6	
시비	2,261,008	2,061,008	91.2	
구비	8,084,884	1,103,854	13.7	

**기대효과**

- 도로개설 사업을 통하여 지역 교통 불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성
- 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업의 집행으로 사유재산권 보호와 도시계획시설 실효 해소

<b>4</b>	<b>도로 및 도로시설물 정비사업</b>	<b>신규 · 계속</b>
----------	------------------------	----------------

<b>도로과</b>	도로과장: 최종구 ☎830-1758 도로관리팀장: 김군성 ☎766 담당: 양태욱, 황성규, 이중제 ☎767,1761,8021
------------	-----------------------------------------------------------------------

관내 노후·파손된 도로와 도로시설물을 적기에 정비하고 지속적인 유지관리로 주민들의 불편을 해소하고, 안전사고 예방과 쾌적한 도시환경 조성

**사업개요**

○ **사업목적**

- 노후화된 도로 및 도로시설물 적기에 정비하여 민원 해소 및 쾌적한 도로 환경 조성에 기여

○ **사업위치** : 관내 일원

○ **사업기간** : 2024. 1. ~ 12.

○ **총사업비** : 8,048,007천원

- 시비 610,707천원, 구비 7,137,300천원, 구 재난관리기금 300,000천원

**추진실적 및 목표(2024. 10. 15. 기준)**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 도로시설물 보수·보강공사	건	1	-	1	1
◦ 도로시설물 정밀안전진단 및 점검용역	건	-	-	3	3
◦ 청련사 진입도로 정비(확장)공사	건	-	-	1	1
◦ 미동초교 앞 보도육교 엘리베이터 설치공사	건	-	-	1	1

## 【 2024년 주요 추진현황 】

### ① 2024년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 계속

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업규모
  - 아스콘포장 154a, 콘크리트포장 14a
  - 측구 정비 665m, 도로경계석 설치 565m

#### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 11. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

#### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,740,000	831,513	47.7	

### ② 2024년 관내 도로시설물 유지보수 공사(연간단가) 계속

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업규모
  - 구조물보수 500㎡, 계단보수 2,000㎡
  - 안전난간 및 디자인난간 설치 500m, 미끄럼방지 포장 24a 등

#### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 11. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

#### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,429,800	899,910	62.9	
구 재난관리기금	300,000	237,740	79.2	

### 3 도로시설물 보수·보강공사 신규

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 증산3교 등 12개소
- 사업규모 : 도로시설물 보수·보강공사 1식
  - 증산3교 등 12개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역결과 ('24. 3월 말)에 따라 실시설계 용역 및 시설물 보수·보강공사 시행

#### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 8. : 실시설계 용역 준공
- 2024. 10. ~ 11. : 공사 시행
- 2025. 8. : 공사 준공

※ 단순보수(8개소)는 “2024년 유지보수공사” 로 시행 중('24.11월 완료)

#### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,381,000	60,324	4.4	

### 4 도로시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 신규

#### 【증산3교 등 12개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역】

#### ○ 사업개요

- 용역내용 : 관내 도로시설물 정밀안전진단(9개소), 정밀안전점검(3개소)
- 과업내용
  - 시설물 현황 및 시설물 정밀 외관조사(상태평가)
  - 구조물 해석에 따른 안전성 평가 및 보고서 작성 등
- 진단대상(9개소)
  - 증산3교, 옥천3교, 연대 앞 지하보도, 연희초교 앞 보도육교, 홍제초교 앞 보도육교, 금화터널입구 차도육교, 연희골다리, 홍제천복개(1), 불광천복개
- 점검대상(3개소)
  - 교남 지하보도, 연대병원 앞 보도육교, 세검정로 옹벽(2)

#### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2022. 7. : 용역 착수
- 2024. 2. : 서울시 정밀안전진단 심의 완료
- 2024. 3. : 용역준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	850,500	766,312	90	낙찰차액 미집행

【홍은대교 등 40개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역】

○ 사업개요

- 용역내용 : 관내 도로시설물 정밀안전진단(16개소), 정밀안전점검(25개소)
- 과업내용
  - ▶ 시설물 현황 및 시설물 정밀 외관조사(상태평가)
  - ▶ 구조물 해석에 따른 안전성 평가 및 보고서 작성 등
- 진단대상(16개소)
  - ▶ 홍은대교, 홍제3교, 연가교, 홍전교, 충정2교, 보도교, 해담는다리, 무명교, 옥천2교, 구서울여상 앞 보도육교, 아현고가 밑 보도육교, 금화초교 앞 보도육교, 홍제천 복개(2), 홍제천 복개(3), 세검정로 옹벽(1), 연세로4길 옹벽
- 점검대상(25개소)
  - ▶ 석축 : 백련사길, 연희로, 성산로, 연희맛로
  - ▶ 옹벽 : 증가로(1), 증가로(2), 응암로, 가좌로, 통일로(1), 통일로(2), 연희로(1), 연희로(2), 성산로(1), 성산로(2), 성산로(3), 성산로(4), 홍제천로, 연세로4길, 홍은동센트레빌, 연희로41가길, 문화촌길, 충정로3가, 연희맛로(1), 연희맛로(2)
  - ▶ 절토사면 : 세검정로

○ 추진현황 및 향후계획

- 2023. 5. : 용역 착수
- 2024. 4. : 과업내용 변경(재하시험, 내진성능평가 등)
- 2024. 10. : 구 정밀안전진단 심의
- 2024. 12. : 용역 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,232,000	590,270	47.9	

## 【옥천교 등 3개소 정밀안전진단 용역】

### ○ 사업개요

- 용역내용 : 관내 도로시설물 정밀안전진단(4개소), 정밀안전점검(1개소)
  - 과업내용
    - 시설물 현황 및 시설물 정밀 외관조사(상태평가)
    - 구조물 해석에 따른 안전성 평가 및 보고서 작성 등
  - 진단대상(4개소)
    - 옥천교, 흥은교, 포방교, 증가로 차도육교
  - 추가 과업대상(1개소)
    - 무악재 하늘다리
- ※ 무악재 하늘다리 등 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역으로 도로 시설물 2개소에 대한 진단 및 점검용역을 별도 발주 할 경우 예정가격이 작아 이행 능력 및 기술 능력이 있는 업체와 계약하기 어려운 관계로 옥천교 등 3개소 정밀안전진단 용역에 해당 사업을 포함하여 수행

### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2023. 12. : 용역 착수
- 2024. 5. : 과업내용 변경(추가)
- 2024. 10. : 구 정밀안전진단 심의 및 용역 준공

### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	265,000	141,097	53.2	
시비	211,000	94,065	44.6	
구비	54,000	47,032	87.1	

**5 청련사 진입도로 정비(확장)공사 신규**

○ 사업개요

- 위 치 : 홍제동 13-77(청련사 진입도로)
- 사업규모
  - 도로 폭 확장 B=3.0~3.5m → B=4~4.5m, L=70m

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 실시설계 용역 발주 및 계약
- 2024. 2. ~ 6. : 용역시행
- 2024. 7.~9. : 공사시행
- 2024. 10. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	450,000	446,450	99.2	

○ 위치도 및 현장사진



**6 미동초교 앞 보도육교 엘리베이터 설치공사 신규**

○ 사업개요

- 위 치 : 충정로2가 160-3(미동초교앞 보도육교)
- 사업규모
  - 미동초교앞 보도육교 엘리베이터 설치 : 2개소

○ 추진현황 및 향후계획

- 2023. 11.~12. : 공사 발주 및 계약
- 2024. 2. : 공사 일시 중지(지장물 이설비용 등 사업비 부족)
  - 부족 예산 : 1,853,911천원(관급비 199,833천원, 이설비 1,630,408천원, 전기공사비 23,670천원)
- 2024. 4. : 서울시 추경 예산 편성 요청

- 2024. 7. : 서울시 2025년 본 예산 편성 요청자료 제출
- 2024. 8. : 서울시 2025년 본 예산 편성 요청 회신(투자심사 선 이행 조건)
- 2024. 10.~ : 자치구 투자심사 진행 완료, '25년 서울시 본예산 편성 미반영 회신


○ 현안사항

- 현장의 위치가 지하철 노선(서대문역~충정로역 사이) 상부며, 굴착이 수반되는 공사로 서울교통공사와 협의 및 지장물(광케이블 등) 이설 등이 선행되어야 하나 관련 사업비 부족으로 공사 일시 중지

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	399,707	-	-	
시비	399,707	-	-	

○ 위치도 및 현장사진

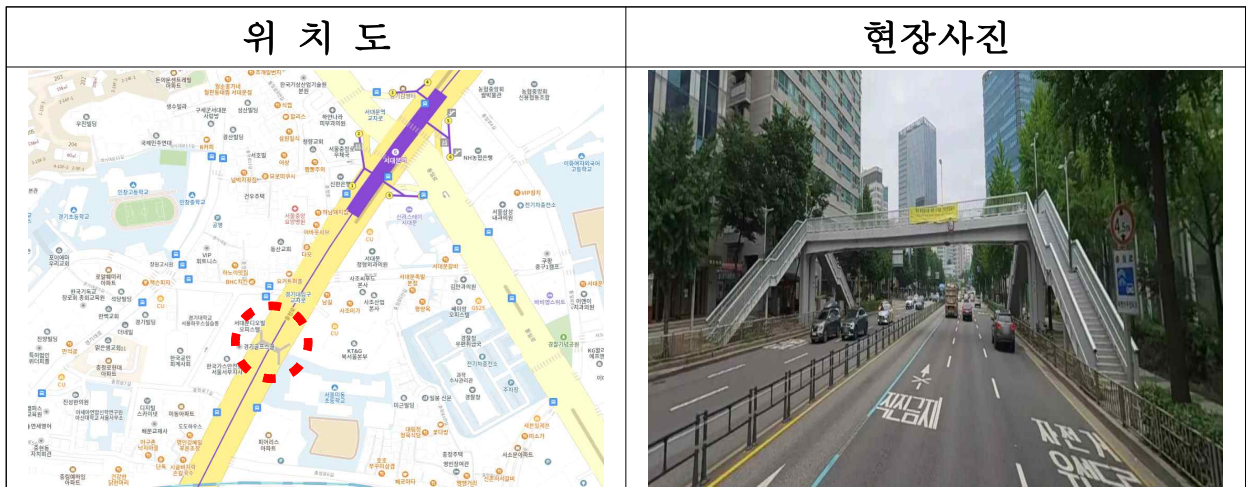

□ 소요예산 (2024년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단기)외 5개사업) (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	8,048,007	3,023,616	37.5	
시비	610,707	144,065	21.8	
구비	7,137,300	2,641,811	37.2	
구 재난관리기금	300,000	237,740	79.2	

□ 기대효과

- 도로 및 도로시설물 적기 정비를 통한 안전사고 예방
- 쾌적한 도로 환경 조성 및 도시미관 개선

<b>5</b>	<b>겨울철 제설대책 추진사업</b>	신규 · 계속
----------	----------------------	---------

도로과	도로과장: 최종구 ☎830-1758 도로관리팀장: 김근성 ☎1766 담당: 양태욱, 황성규, 정재욱 ☎1767, 1761, 1875
-----	---------------------------------------------------------------------------

겨울철 설해 등 자연재해를 대비한 철저한 제설대책 추진으로 차량통행 불편을 해소하고 안전사고 예방

**사업개요**

○ 사업목적

- 겨울철 폭설과 결빙 등으로 인한 차량 통행불편 해소 및 안전사고 예방

○ 사업위치 : 관내 일원

○ 사업기간 : 2024. 11. 15. ~ 2025. 3. 15.

○ 총사업비 : 2,921,525천원

- 시비 15,600천원 구비 1,081,328천원 구 재난관리기금 474,597천원 특별교부금 1,350,000천원

**추진실적 및 목표(2024. 10. 15. 기준)**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 2024/2025년 제설대책 용역	건	1	1	0	1
◦ 이동식 염수살포장치 임차용역	개소	7	11	0	11
◦ 제설도구함 구매 및 설치	개소	-	-	0	16
◦ 도로과 제설발전기지 및 장비·자재창고 설치공사	건	-	-	1	1

**【 2024년 주요 추진현황 】**

**① 2024/2025년 제설작업 용역** 계속

○ 사업개요

- 위치 : 관내 주요간선도로 및 이면도로

- 사업규모 : 총 25개 노선(연장 32.2km)

- 추진현황 및 향후계획
  - 2024. 10. : 용역발주
  - 2024. 11. ~ 2025. 3. : 제설용역 시행
  - 2025. 3. 15. : 용역준공

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	461,000	-	-	

※ 동주민센터 제설용역 추경예산(280,000천원) 포함 발주 예정

2 이동식 염수살포장치 임차용역 계속

- 사업개요
  - 용역내용 : 관내 제설취약구역 이동식 염수살포장치 설치 및 유지보수
  - 설치대상 : 서대문우체국 등 11개소

- 추진현황 및 향후계획
  - 2024. 10. : 용역발주
  - 2024. 11. ~ 2025. 3. : 제설용역 시행
  - 2025. 3. 15. : 용역준공

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	77,000	-	-	

3 제설대책관련 제설도구함 구매 및 설치 신규

- 사업개요
  - 위 치 : 관내 제설 취약구역
  - 사업규모 : 이면도로 등 제설취약구역 약 16개소

- 추진현황 및 향후계획
  - 2024. 10. : 제설도구함 구매·설치

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
시비	15,600	13,830	88.6	

#### ④ 도로과 제설발전기지 및 장비·자재창고 설치공사 신규

##### ○ 사업개요

- 위치 : 홍제동 454-1(유원하나 APT 옆)
- 사업규모
  - 부지조성(지상 2등, 건축면적 1,159.19㎡)
  - 제설 장비·자재 창고 및 사무실 설치

##### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2 ~ 2024. 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 4. ~ 2024. 5. : 도면 보완설계, 가설울타리(방음벽) 설치
- 2024. 6. : 공사 시행
- 2024. 6.~8. : 철거폐기물 반출 및 가림막 기초작업, 부지조성 작업
- 2024. 8.~9. : 배수로, H빔 설치, 옹벽(SRC) 기둥 철근배근, 바닥포장 등
- 2024. 10. : 공사 준공

##### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	2,547,925	1,418,398	55.6	
특별교부금	1,350,000	403,000	29.8	10월준공 집행예정
구비	723,328	723,328	100	23년 집행완료
구 재년관리기금	474,597	292,070	61.5	10월준공 집행예정

##### ○ 위치도 및 현장사진



소요예산 (2024/2025년 제설대책 용역 외 3개 사업)

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	2,921,525	1,432,228	49	
시비	15,600	13,830	88.6	
구비	1,081,328	723,328	66.5	
구 재난관리기금	474,597	292,070	61.5	
특별교부금	1,350,000	403,000	29.8	

기대효과

○ 겨울철 도로결빙 등으로 인한 주민·차량 통행불편 해소 및 안전사고 예방

위치도 및 현장사진

○ 이동식 염수 살포장치

<p>1. 위치도(서대문우체국)</p>	<p>현황사진</p>
<p>2. 위치도(연희로11자길 앞)</p>	<p>현황사진</p>
<p>3. 위치도(명지길 114)</p>	<p>현황사진</p>



4. 위치도(홍은동 190-7)



현황사진



5. 위치도(교수단지)



현황사진



6. 위치도(대현교회 앞)



현황사진



7. 위치도(성산로11길 40 일대)



현황사진



8. 위치도(홍제1동 주민센터)




현황사진



9. 위치도(세검정로4나길 30 앞)



현황사진

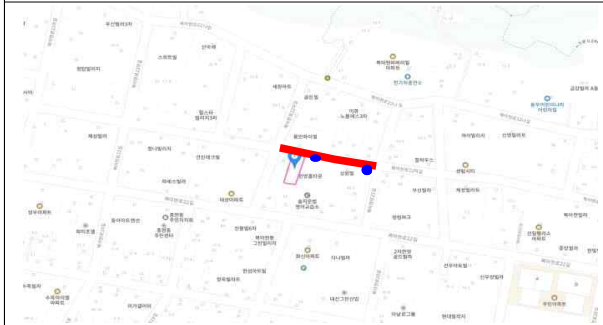

10. 위치도(북아현동 1-336 일대)



현황사진



11. 위치도(연희동 1-86, 연희동 1-65, 연희동 1-49)



현황사진

<b>6</b>	<b>보도 및 보도시설물 정비사업</b>	신규 · 계속 공모
----------	------------------------	---------------

도로과	도로과장: 최중구 ☎330-1758 보도관리팀장: 홍상필 ☎1172 담당: 박우영, 황지은 ☎1768,8505
-----	---------------------------------------------------------------

관내 노후 및 파손된 보도를 적기에 정비하고, 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설등을 정비하여 보행안전과 교통약자의 이동편의를 개선하고자 함.

**사업개요**

○ 추진방향

- 노후 보도정비를 통하여 안전하고 쾌적한 보행환경 조성
- 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설등을 정비하여 교통약자 이동편의 증진

○ 보도현황

- 보도연장 : 104,249m
  - ▶ 시도 : 통일로 등 13개 노선 45,086m
  - ▶ 구도 : 거북골로 등 108개 노선 59,163m
- 보도면적 : 283,721㎡[시도 124,268㎡, 구도 159,453㎡]

○ 총사업비 : 4,223,756천원

- 시비 2,112,000천원, 구비 1,611,756천원, 특별교부금 500,000천원

**추진실적 및 목표(2024. 10. 15. 기준)**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 관내 보도유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 노후보도 정비사업	건	5	2	4	4
◦ 보행환경 개선사업	건	-	-	1	1

## 【 2024년 주요 추진현황 】

### ① 2024년 관내 보도유지보수공사(연간단가) 계속

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업규모
  - 보도정비 90a, 측구 및 경계석 정비 1,500m
  - 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비 50개소
  - 디자인형 울타리 500m 설치 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

#### ○ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 12. : 공사시행(공정율 : 80%)
- 2024. 12. : 공사준공

#### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	1,706,000	734,568	43.1	
시비	856,000	337,633	39.4	
구비	850,000	364,426	42.9	

### ② 노후보도 정비사업 신규

#### 【성산로 노후보도 정비공사】

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 연희동 375-11 ~ 연희동 218-1
- 사업규모
  - 보도정비 18a, 측구 및 경계석 정비 900m, 가로수 보호판 정비 79개소 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.

#### ○ 추진실적


- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 6. : 공사시행
- 2024. 6. 28. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
시비	800,000	776,361	97.1	낙찰차액 미집행

○ 위치도 및 완료사진

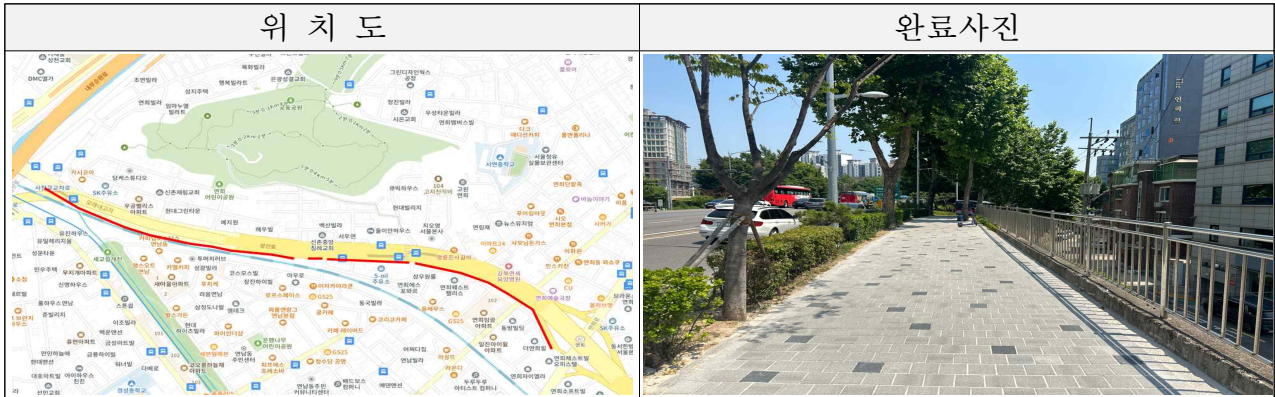

【통일로 독립공원 주변 노후보도 정비공사】

○ 사업개요

- 위 치 : 독립공원 교차로 ~ 독립문역 5번 출구
- 사업규모
  - 보도정비 10.5a, 측구 및 경계석 정비 300m 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.

○ 추진실적


- 2024. 1. : 공사설계
  - 2024. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약
  - 2024. 4. ~ 6. : 공사완료
- ※ 2024년 관내 보도 유지보수공사(연간단가) 연계 시행

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	500,000	437,130	87.4	낙찰차액 미집행

○ 위치도 및 완료사진

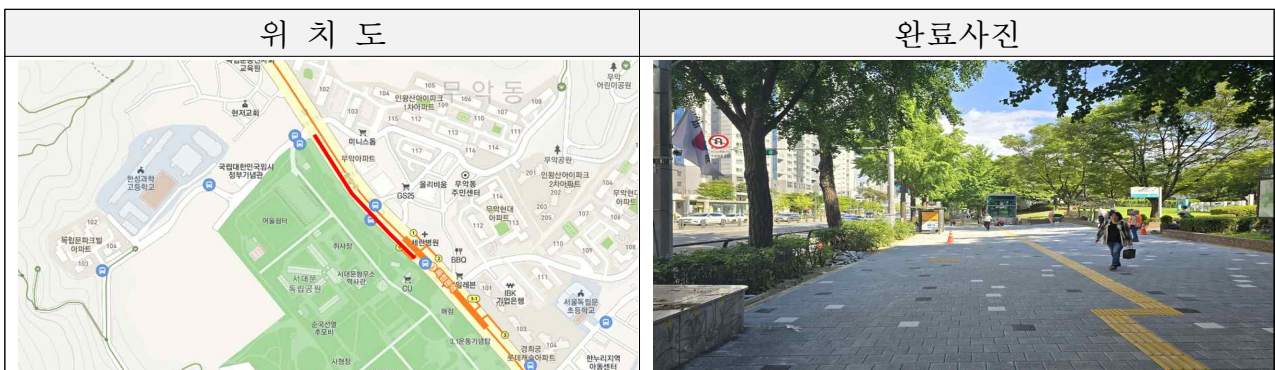

**【한성과학고등학교 일대 노후보도 정비공사】**

○ 사업개요

- 위 치 : 현저동 산 5-5 ~ 현저동 101-316
- 사업규모
  - 보도정비 7a, 측구 및 경계석 정비 310m, 아스팔트포장 26a 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.

○ 추진실적


- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 6. : 공사시행
- 2024. 6. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	331,556	331,520	99.9	

○ 위치도 및 완료사진

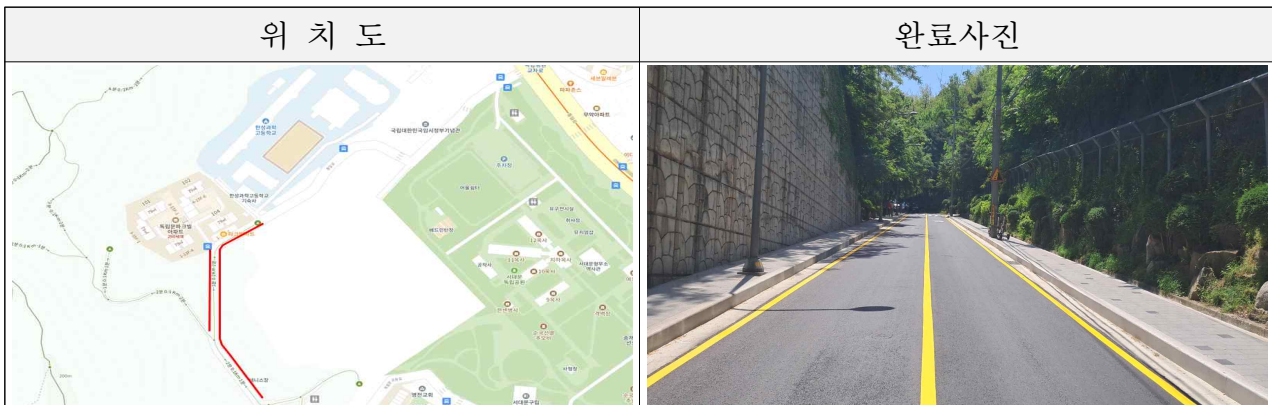

**【증가로8길 도로구조 개선사업】**

○ 사업개요

- 위 치 : 증가로 4길 59 ~ 증가로 8길 70
- 사업규모
  - 보도정비 3a, 측구 및 경계석 정비 300m, 아스팔트포장 7a 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.

○ 추진실적

- 2024. 1. : 공사설계
- 2024. 2. : 공사발주 및 계약
- 2024. 3. ~ 5. : 공사시행
- 2024. 6. 4. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	236,200	235,200	99.6	낙찰차액 미집행

○ 위치도 및 완료사진



3 북가좌사거리 일대 보행환경 개선사업 공모

○ 사업개요

- 위 치 : 응암로 107 ~ 증가로 261
- 사업규모 : 보도포장 11a, 아스팔트포장 25a 등
- 사업기간 : 2024. 2. ~ 2025. 11.
- 주요 사업내용
  - ▶ 차도 축소 및 보도 확장(양방향 b=5m → b=7m)
  - ▶ 고원식 횡단보도 6개소, 횡단보도 경계석 정비 등 보행편의시설 설치
  - ▶ 한전주 및 통신주, 교통신호기 이설 등

○ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 2. ~ 7. : 설계용역 시행 및 준공
- 2024. 8. 21. : 사업추진계획 변경 방침수립
- ※ 2025년 지중화 사업 대상 신청으로 '25. 1월 지중화 사업 선정 결과에 따라 사업 추진 시기 조정
- 2025. 2. : 공사 발주
- 2025. 3. ~ 11. : 공사 시행 및 준공

○ 소요예산


- 총예산 : 650,000천원
  - ▶ 시비 456,000천원, 구비 194,000천원

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	650,000	39,499	6.1	사업시기 조정
시비	456,000	39,499	8.7	
구비	194,000	-	-	

○ 위치도 및 현장사진

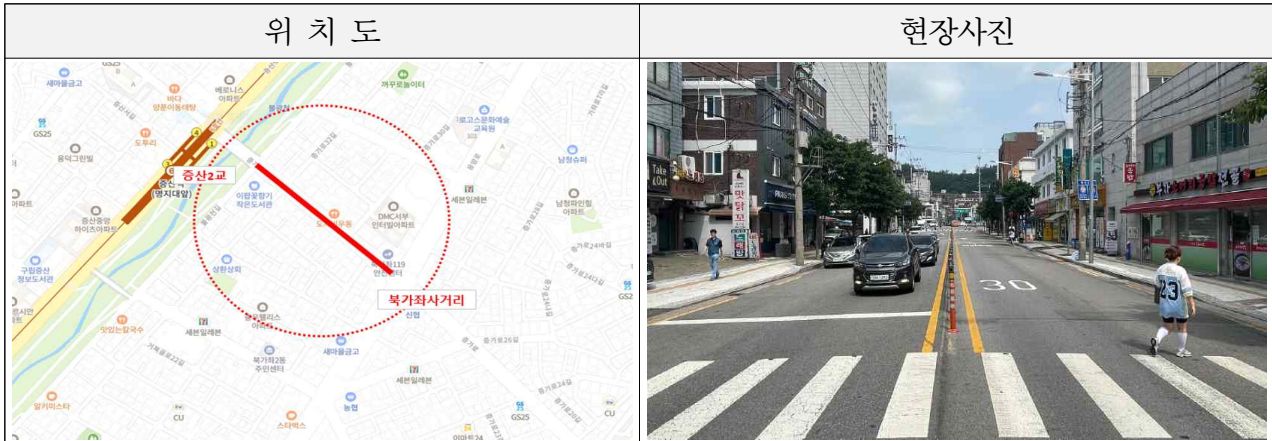

소요예산(2024년 관내 보도유지보수공사(연간단가)외 5개 사업) (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	4,223,756	2,521,769	59.7	
시비	2,112,000	1,153,493	54.6	
구비	2,111,756	1,368,276	64.8	

기대효과

- 보행 장애 위험요소 해소로 각종 안전사고 예방
- 쾌적한 보행환경 조성 및 도시미관 개선

<b>7</b>	<b>도로굴착복구 및 불량맨홀 정비사업</b>	<b>계속</b>
----------	---------------------------	-----------

<b>도로과</b>	도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로굴착팀장: 고진성 ☎1769 담당: 김범진, 고나운 ☎1771, 1747
------------	----------------------------------------------------------------

굴착된 도로의 신속한 원상복구와 사후관리를 통해 원활한 도로기능을 유지하고, 불량맨홀을 적기에 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

**사업개요**

○ 사업목적

- 굴착된 도로의 신속한 원상복구 및 사후관리
- 침하, 주변파손 등이 발생한 불량맨홀의 적기 정비

○ 위    치 : 서대문구 관내

○ 기    간 : 2024. 3. ~ 12. 31.

○ 총사업비 : 1,183,569천원

- 기금 1,081,263천원(도로굴착복구), 구비 102,306천원(불량맨홀정비)

**추진실적 및 목표**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 도로굴착복구공사(연간단가)	건	1	1	1	1
◦ 불량맨홀정비공사(연간단가)	건	1	1	1	1

**[ 2024년 주요 추진현황 ]**

**① 도로굴착복구공사(연간단가) 계속**

○ 사업개요

- 위    치 : 서대문구 관내
- 사업규모
  - 아스팔트포장 복구 및 정비 77a, 고압블록포장 5.2a 등
- 사업기간 : 2024. 3. 8. ~ 12. 31.

○ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 3. 8. : 공사착공
- 2024. 3. 19. ~ 9. 20. : 제1~7차 작업완료(공정율 : 85%)
- 2024. 10. ~ 12. 31. : 공사시행 및 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)
계	1,081,263	706,046	65
기금	1,081,263	706,046	65

불량맨홀 정비공사(연간단가) 계속

○ 사업개요

- 위치 : 서대문구 관내
- 사업규모 : 불량맨홀정비 63개소
- 사업기간 : 2024. 5. 10. ~ 12. 31.

○ 추진실적 및 향후계획

- 2024. 5. 10. : 공사착공
- 2024. 5. 16. ~ 9. 6. : 제1~3차 작업완료(공정율 : 72%)
- 2024. 10. ~ 12. 31. : 공사시행 및 준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)
계	102,306	34,760	34
구비	102,306	34,760	34

소요예산(2024년 관내 도로굴착복구공사(연간단가)외 1개 사업) (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	1,183,569	740,806	63	
기금	1,081,263	706,046	65	도로굴착복구공사
구비	102,306	34,760	34	불량맨홀정비공사

기대효과

- 굴착된 도로의 신속한 원상복구 및 사후관리로 안전하고 쾌적한 도로유지 및 관리
- 도로상 설치된 불량맨홀 적기 정비를 통해 안전사고 예방 및 도로환경 개선

<b>8</b>	<b>세검정로1길 보행자우선도로 조성</b>	<b>공모</b>
----------	--------------------------	-----------

<b>도로과</b>	도로과장: 최중구 ☎330-1758 교통시설팀장: 조승현 ☎1812 담당: 김혜지 ☎1870
------------	-----------------------------------------------------

보·차도가 미분리되고 보행자 통행이 많은 이면도로인 세검정로1길을 보행자우선도로로 지정하여 보행자 안전성을 강화하고 보행환경을 개선코자 함.

**사업개요**

- 위 치 : 서대문구 세검정로1길(홍은중앙로 55~세검정로1길96)
- 규 모 : 폭 6~12m, 길이 175m (면적 1400㎡)
- 사업내용
  - 아스콘 포장 및 디자인포장(857㎡), 발광형 과속경보시스템 표지판(2개소)
  - 태양광 LED표지병(112개소), 보행자우선도로 안내표지판(4개소)
- 사업기간 : 2024. 04. ~ 10.
- 총사업비 : 120,000천원
  - 국비 60,000천원, 구비 60,000천원
- 지정현황 : 13개 구간 2.7km (2015년~2023년)

**추진실적 및 목표(2024. 10. 15. 기준)**

- 2024. 01. 05. : 보행자우선도로 행정안전부 공모서 제출
- 2024. 03. 26. : 보행자우선도로 공모 선정
- 2024. 05. 28. : 국비 확보(60,000천원)
- 2024. 07. 18. : 주민간담회 개최
- 2024. 08. 08. : 보행자우선도로 공고
- 2024. 09. 05. : 보행자우선도로 지정 고시(서울시)
- 2024. 10월 : 보행자우선도로 조성 완료

소요예산


(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	120,000	119,980	100%	
국비	60,000	59,990	100%	
시비	-	-	-	
구비	60,000	59,990	100%	
기타	-	-	-	

기대효과

- 보행자우선도로 조성을 통한 보행자 보호 강화 및 안전성 증진

현장사진

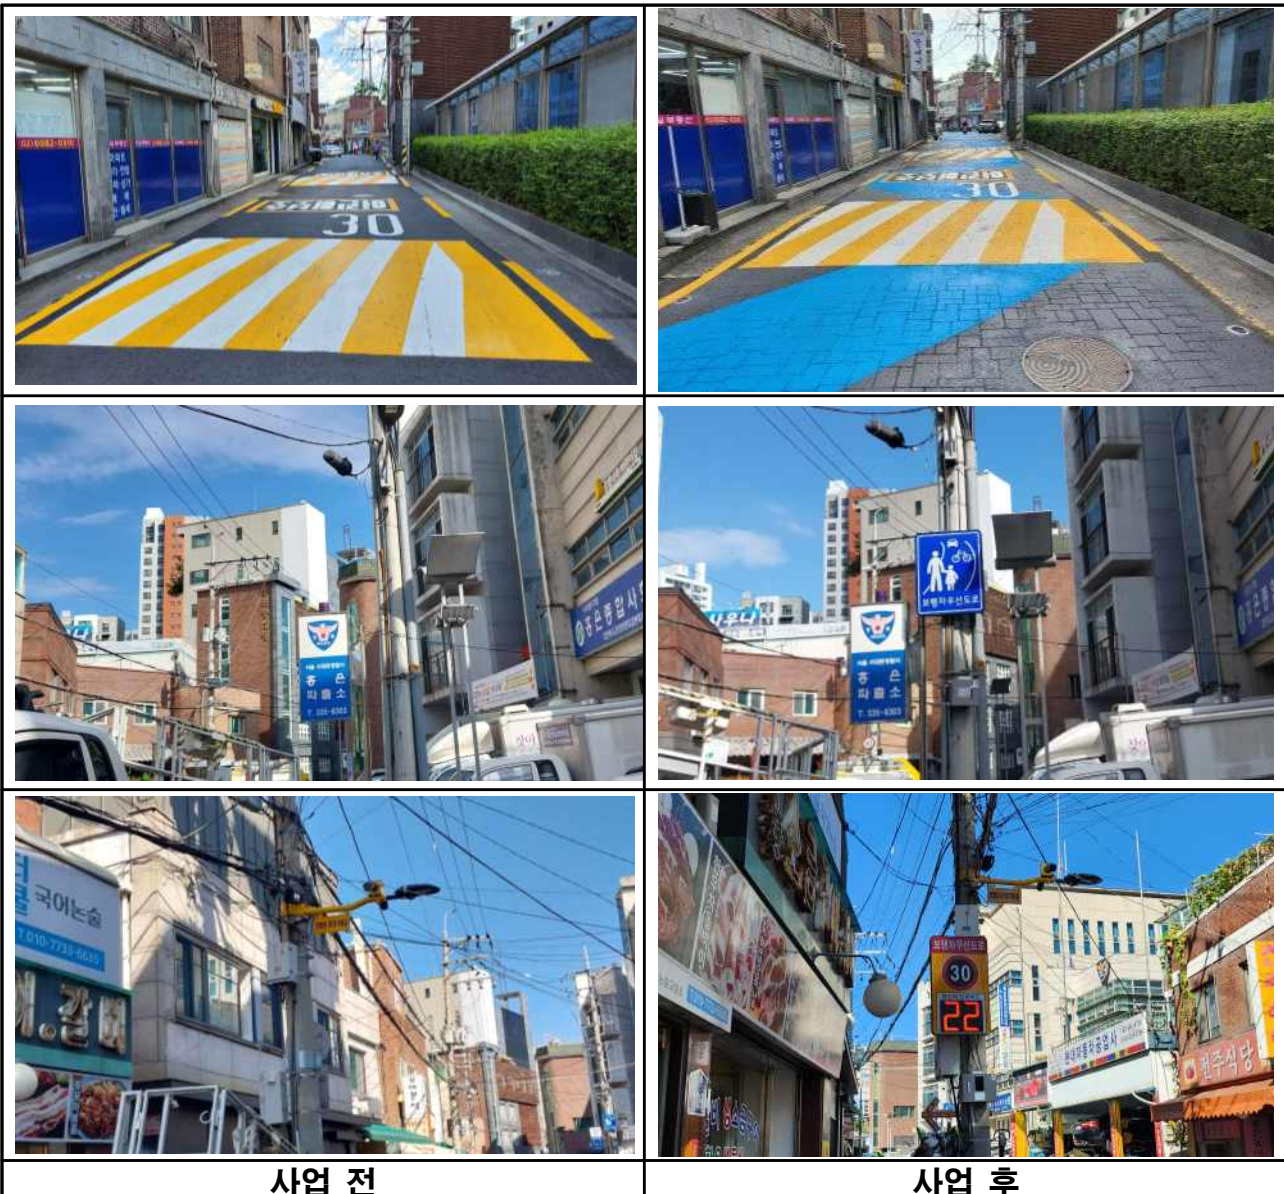

사업 전

사업 후

## 9

## 대중교통 편의제공을 위한 스마트쉼터 확대 설치

신규

## 도로과

도로과장: 최중구 ☎330-1758 교통시설팀장: 조승현 ☎1812 담당: 유영산 ☎1797

버스정류소 편의시설인 스마트쉼터를 확대 설치하여 주민의 교통편의 증진 및 대중교통이용활성화에 기여코자 함.

 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 11.
- 내 용 : 스마트쉼터 설치(3개소)
- 설치위치

정류소 명칭	정류소 위치	경유노선
동신병원	동신병원 건너편	110B, 163, 7713, 7720, 7738, 서대문03
DMC래미안e편한세상 2·4단지	강남할인마트 앞	721, 742, 761, 7613, 7713, 7739,
신촌기차역	신촌지구대 위	742, 5713, 7017

※ 설치현황 (2023년) : 6개소 (DMC파크뷰자이 1·2단지, DMC파크뷰자이별동상가, DMC센트레빌, 연세로명물거리, 신촌전철역)

- 총사업비 : 210,000천원 (구비)
- 주요기능
  - 자동문, 냉·난방기, 디지털샤이니지, 미세먼지 내·외부 센서, 환기·청정·살균시스템, 무선충전기, CCTV, 버스도착알리미 등
  - 내부 설정온도에 따라 냉·난방기 자동작동 되며 긴급상황발생 시 필요에 따라 원격제어 가능

 추진실적 및 목표(2024. 10. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 스마트쉼터 확대 설치	개소	-	6	-	3

## 【 2024년 추진현황 】

- 2024. 3. ~ 6. : 현장조사 및 대상지점 선정 확정
- 2024. 7. ~ 8. : 스마트쉼터 제작업체 선정 및 디자인 의뢰
- 2024. 9. : 스마트쉼터 제작 및 부대공사 발주
- 2024. 9. 26. : 띠녹지 및 가로수 제거(푸른도시과)
- 2024.10.07. ~ 10.08. : 신촌기차역, 동신병원 쉼터 설치
- 2024.10.09. : DMC라미안e편한세상2·4단지 쉼터 설치

## 소요예산

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	210,000	-	-	11월 집행 예정


## 향후계획

- 2024. 10. ~ 11. : 전기, 통신, CCTV 등 부대공사 시행
- 2024. 11. : 준공 및 운영

## 기대효과

- 대중교통 이용주민 편의제공으로 대중교통이용활성화 기대
- 스마트쉼터 설치에 따른 대중교통서비스 향상으로 주민만족도 증가

## 위치도 및 현장사진

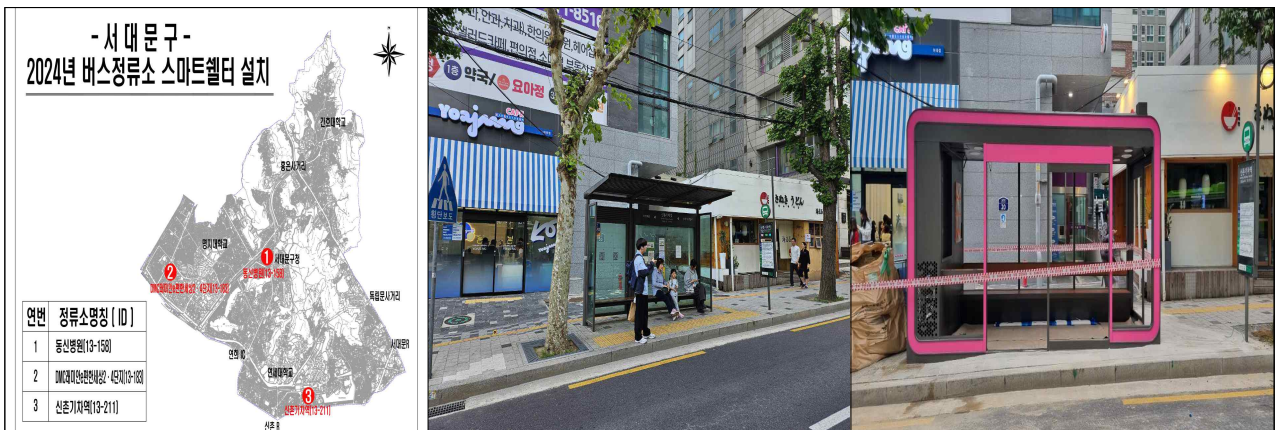

<b>10</b>	<b>가로변 마을버스정류소 온열의자 확대 설치</b>	<b>신규</b>
-----------	-------------------------------	-----------

<b>도로과</b>	도로과장: 최중구 ☎330-1758 교통시설팀장: 조승현 ☎1812 담당: 유영산 ☎1797
------------	-----------------------------------------------------

버스승차대 설치가 어려운 마을버스정류소에 온열의자를 설치하여 민원 사항 해소 및 주민편의 증진으로 대중교통이용 활성화에 기여코자 함.

**사업개요**

- 기 간 : 2024. 3. ~ 12.
- 설치위치 : 문화촌현대아파트 등 72개소 (마을버스정류소 282개소)  
 ※ 기존 설치현황 : 흥은2동주민센터 등 6개소
- 총사업비 : 400,000천원 (시비)
- 기 능 : 외부온도 18° 이하시 자동 점등되어 38° 까지 온도 상승

**추진실적 및 목표(2024. 10. 15. 기준)**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 마을버스 정류소 온열의자 확대 설치	개소	5	1	-	72

※ 전기공사비 증액에 따른 온열의자 설치 목표 축소 (당초 100개→변경 72개)

**【 2024년 추진현황 】**

- 2024. 5. ~ 8. : 마을버스정류소 전수조사 및 대상지점 확정
- 2024. 8. ~ 9. : 사업계획수립 및 업체선정
- 2024. 9. 4. : 온열의자 디자인 협의 및 확정

**소요예산**

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	400,000	-	-	11월 집행 예정

**향후계획**

- 2024.10. ~ 11. : 제작·설치 및 전기공사
- 2024. 12. ~ : 공사 준공 및 운영

**기대효과**

- 대중교통 이용주민 편의제공으로 대중교통이용활성화 기대
- 온열의자 설치에 따른 대중교통서비스 향상으로 주민만족도 증가

**설치현황 사진**



설치사례 (2023년)

## 도로과

도로과장: 최중구 ☎330-1758 지하안전팀장: 이석중 ☎8594 담당: 김보미, 박한솔 ☎1772, 1969

지하를 안전하게 개발하기 위한 안전관리체계를 확립하고, 공동탐사 및 분석을 통하여 도로함몰·지반침하 등 안전사고를 사전에 예방하고 안전한 도로환경을 조성하고자 함.

 사업개요

## ○ 사업목적

- 지하시설물 주변 지반 및 지하 개발 공사장 주변 안전점검
- 공동탐사 및 분석을 통한 도로함몰·지반침하 등 안전사고 사전예방

## ○ 위 치 : 서대문구 관내

## ○ 총사업비 : 346,730천원

- 시비 45,000천원, 구비 301,730천원

 추진현황 및 목표 (2024. 10. 15. 기준)

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 지하안전관리	건	1	1	1	1
◦ 관내 도로(보도) 지하 공동탐사 용역	건	0	1	1	1
◦ 지반침하 우려구간 공동조사(특별점검) 용역	건	0	0	1	1

**【 2024년 주요 추진현황 】**
**1] 지하안전관리** 계속

## ○ 사업개요

- 위 치 : 서대문구 관내
- 매년 2월말까지 지하안전관리계획 수립
- 지하개발공사장 안전점검 실시(굴착깊이 10m 이상)
- 지하안전평가서 검토(굴착깊이 10m 이상)
- 지하시설물 안전관리규정 심사
- 유관기관 협의체 구성 및 운영

○ 추진현황

- 2024.02. : 지하안전관리계획 수립
- 2024.03. : 해빙기 지하시설물 및 지하개발사업장 안전점검
- 2024.03. : 지하안전관리 유관기관(부서) 교육
- 2024.06. : 서대문구 지하안전위원회 위원 위촉
- 2024.06. : 우기 지하시설물 및 지하개발사업장 안전점검
- 2024.02. ~ 06. : 지하안전관리규정 심사
- 2024.09. ~ 10. : 성산로 지반침하 관련 특별 안전점검
- 2024.09. ~ 10. : 관내 지하시설물 및 지하개발사업장 특별 안전점검

○ 소요예산 및 집행현황 (단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	1,730	1,728	99.9	

2 관내 도로(보도) 지하 공동탐사 용역 계속

○ 용역개요

- 대 상 지 : 서대문구 관내 도로(보도) 99km
  - 홍은1·2동, 홍제2동, 북가좌1·2동, 남가좌1·2동
- 과업내용
  - 1차 탐사(보도형 멀티형 GPR - 공동탐사) : 연장 99km,
  - 2차 조사(천공 및 내시경 조사) : 32개소(목표공동)
  - 공동신속복구(친환경 유동성채움재) : 29개소
- 용역기간 : 2024.06. ~ 12.

○ 추진현황

- 2024.02. : 용역 시행
- 2024.06. : 용역 계약 및 착수
- 2024.08. ~ 10. : 1차 탐사(보도형 멀티형 GPR - 공동탐사) 및 공동 분석

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
구비	255,000	147,170	58	집행시기 미도래

③ **지반침하 우려구간 공동조사(특별점검) 용역** 신규

○ 용역개요

- 대 상 지 : 서대문구 관내 도로(구도) 및 지하개발사업현장
  - ▶ 연장 32km(차도 9.6km, 보도 1km 3회 반복)
- 과업내용
  - ▶ 1차 탐사(GPR - 공동탐사) : 연장 32km (차도 9.6km, 보도 1km 3회반복)
  - ▶ 2차 조사(천공 및 내시경 조사) : 10개소(목표공동)
  - ▶ 공동신속복구(친환경 유동성채움재) : 9개소
- 용역기간 : 2024.06. ~ 12.

○ 추진현황

- 2024.05. : 용역 시행
- 2024.06. : 용역 계약 및 착수
- 2024.07. ~ 8. : 1회차 완료 (1차 탐사, 2차조사 및 공동신속복구 1개소)
- 2024.08. ~ 10. : 2회차 완료 (1차 탐사, 2차조사 및 공동신속복구 2개소)

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	90,000	0	0	
시비	45,000	0	0	재난안전정책과 예산
구비	45,000	0	0	재난안전과 예산

**소요예산(지하안전관리 외 2개 사업)**

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	346,730	148,898	43	집행시기 미도래
시비	45,000	0	0	
구비	301,730	148,898	49	

**향후계획**

**1 지하안전관리** 계속

- 2024. 10. ~ 12. : 서대문구 공동조사 협력체계 구축·운영

**2 관내 도로(보도) 지하 공동탐사 용역** 계속

- 2024. 10. ~ 11. : 2차 조사 및 공동 신속복구
- 2024. 12. : 용역 준공

**3 지반침하 우려구간 공동조사(특별점검) 용역** 신규

- 2024. 10. ~ 11. : 3회차 공동조사 및 신속복구
- 2024. 12. : 용역 준공

**기대효과**

- 지하안전 확보 및 지하개발공사장 안전사고 예방
- 관내 도로 지하 공동탐사를 통한 도로 공동의 원인을 제거하여 안전한 도로환경 조성

<b>12</b>	<b>가로등 · 보안등 보수 및 개량사업</b>	계속
-----------	----------------------------	----

도로과	도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로조명팀장: 소해준 ☎1980 담당:김재형,장민정 ☎1981,1763
-----	-------------------------------------------------------------

도로조명시설 고장 시 신속한 보수 및 노후 · 불량시설 정비로 전기안전 사고 예방과 야간 이용주민들에게 쾌적하고 안전한 도로 환경 제공

**사업개요**

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용
  - 가로등 · 보안등 부점등 등 고장시설물에 대한 신속 유지보수
  - 노후 · 불량 도로조명 시설물을 고효율 LED등기구로 개량
- 사업규모
  - 가로등 : 연희로 외 54개 노선, 6,015등

구 분	총 계	세부시설현황			분전반
		차도등	보행등	기타 (육교등, 교량하부등)	
총 계	6,015	3,813	2,111	71	217
시 도	3,720	2,323	1,326	71	122
구 도	2,295	1,495	800	-	95

- 보안등 : 14개동, 9,461등

구 분	총 계	세부시설현황				비 고
		전용주	한전주	통신주	벽부등 (건축물)	
총 계	9,461	1,090	4,567	610	3,194	14개동

○ 총사업비 : 804,000천원(구비)

**추진현황 및 목표**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
가로등 유지보수공사(연간단가)	건	1	1	1	1
보안등 유지보수공사(연간단가)	건	2	2	2	2
에너지절약 보안등 개량공사(연간단가)	건	1	1	1	1

## 【 2024년 주요 추진현황 】

### ① 가로등 유지보수공사(연간단가) 계속

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 서대문 관내
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업규모 : 가로등 6,015등 유지보수 및 민원처리 등

#### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. 1. : 공사시행
- 2024. 12. 31. : 공사준공

#### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	136,000	99,530	73.2	
구비	136,000	99,530	73.2	

### ② 보안등 유지보수공사(연간단가) 계속

[2024년 주택가 좋은빛환경 조성 보안등 보수공사(연간단가-1구역)]

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 홍제1동 외 8개동  
(홍제1·2·3동, 홍은1·2동, 남가좌1·2동, 북가좌1·2동)
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업규모 : 보안등 5,006등 유지보수 및 민원처리 등

#### ○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. 1. : 공사시행
- 2024. 12. 31. : 공사준공

#### ○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	136,000	95,663	70.3	
구비	136,000	95,663	70.3	

[2024년 주택가 좋은빛환경 조성 보안등 보수공사(연간단가-2구역)]

○ 사업개요

- 위 치 : 연희동 외 4개동(연희동, 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동)
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업규모 : 보안등 4,455등 유지보수 및 민원처리 등

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 1. 1. : 공사시행
- 2024. 12. 31. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	126,000	89,030	70.6	
구비	126,000	89,030	70.6	

③ 에너지절약 보안등 개량공사(연간단가)

계속

○ 사업개요

- 위 치 : 서대문구 관내
- 사업내용 : 2024. 2. ~ 2024. 12.
- 사업규모 : LED 보안등 350등 신설 및 개량
- 사업기간 : 2024. 2. ~ 2024. 12.

○ 추진현황 및 향후계획

- 2024. 2. : 사업계획 수립 및 설계
- 2024. 3. : 공사발주
- 2024. 4. : 공사시행
- 2024. 12. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	406,000	289,331	71.3	
구비	406,000	289,331	71.3	

총 소요예산(가로등 유지보수공사 외 2건)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	804,000	573,554	71.3	
구비	804,000	573,554	71.3	

기대효과

- 노후된 등기구를 교체하여 전기안전사고 예방 등 안전한 밤거리 조성
- 고효율·저소비 LED 등기구 교체로 도시미관 제고 및 에너지 절감 기여

<b>13</b>	<b>범죄사각지대 해소를 위한 안산산책로 보안등 설치사업</b>	<b>신규</b>
-----------	-----------------------------------------	-----------

**도로과**

도로과장: 최중구 ☎330-1758 도로조명팀장: 소해준 ☎1980 담당: 김재형 ☎1981

최근 발생하는 무차별 범죄로 구민들의 불안감이 높아지고 있어, 안산산책로 등 우범지역에 스마트보안등(CCTV) 및 비상벨을 설치하여 주민 불안 해소 및 안전한 보행환경을 제공코자 함

**사업개요**

- 사업위치 : 안산산책로 (연희로32길 90 ~ 연희동 산2-17)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 6.
- 사업규모 : 보안등 27개소 및 비상벨(관제용 CCTV 포함) 4개소 설치
- 사업내용 : 노후된 기존 보안등 철거 및 비상벨 연계한 스마트보안등 설치
- 총사업비 : 246,000천원(구비)

**추진현황 및 목표**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
◦ 스마트보안등 설치	개소	-	-	27	27
◦ 비상벨 설치(관제용 CCTV 포함)	개소	-	-	4	4

○ **추진현황**

- 2024. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
- 2024. 3. : 사업계획 변경
- 2024. 4. : 공사시행(전기, 통신)
- 2024. 6. : 공사준공

○ **소요예산 및 집행현황**

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	246,000	226,657	92.1	낙찰차액
구비	246,000	226,657	92.1	

## □ 기대효과

- 등산로 이용 주민들에게 밝은 보행환경 조성 및 실시간 CCTV 촬영을 통해 안전사각지대 해소 및 무차별범죄 사전 예방
- 관제센터 모니터링이 가능한 비상벨 설치 등 치안 인프라 개선으로 범죄 사각지대 및 구민 불안감 해소

## □ 위치도 및 현장사진



<b>14</b>	<b>서대문 명소 홍보조명 설치 사업</b>	<b>신규</b>
-----------	--------------------------	-----------

<b>도로과</b>	도로과장: 최종구 ☎330-1758 도로조명팀장: 소해준 ☎1980 담당: 박정미, 장민정 ☎1982,1763
------------	---------------------------------------------------------------

서대문 명소인 『홍제천 인공폭포』 및 『무악재 하늘다리』를 위한 홍보조명을 설치하여 야간 볼거리 제공 및 이용자 활성화를 제고코자 함

**사업개요**

- 사업위치 : 서대문구 관내
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 10.
- 사업규모
  - 홍제천 인공폭포 홍보조명 2개소 설치
  - 무악재 하늘다리 홍보조명 2개소 설치
- 사업내용 : 홍보조명 설치를 통한 서대문구 명소 홍보효과 제고
- 총사업비 : 230,000천원(구비)

**추진현황 및 목표**

추진내용	단위	2022년 실적	2023년 실적	2024년	
				실적	목표
○ 홍제천 인공폭포 홍보조명 설치	개소	-	-	2	2
○ 무악재 하늘다리 홍보조명 설치	개소	-	-	2	2

**[ 2024년 주요 추진현황 ]**

**① 서대문구 홍제천 인공폭포 홍보조명 설치** 신규

- 사업개요
  - 사업기간 : 2024. 3. 1. ~ 2024. 10. 31.
  - 사업위치 : 홍제천 홍연교 내
  - 사업내용 : 홍제천 인공폭포 활성화 조형물(경관조명 등) 설치
  - 사업비 : 150,000천원(구비)
- 추진현황 및 향후계획
  - 2024. 3. : 디자인 기본계획 수립(도시관리과)
  - 2024. 4. : 도로시설물 사용 관련 유관기관 협의(서부도로사업소)


- 2024. 6. : 디자인 설계용역 시행
- 2024. 8. : 공사시행
- 2024. 10. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	150,000	150,000	100	
구비	150,000	150,000	100	

○ 위치도 및 현장사진

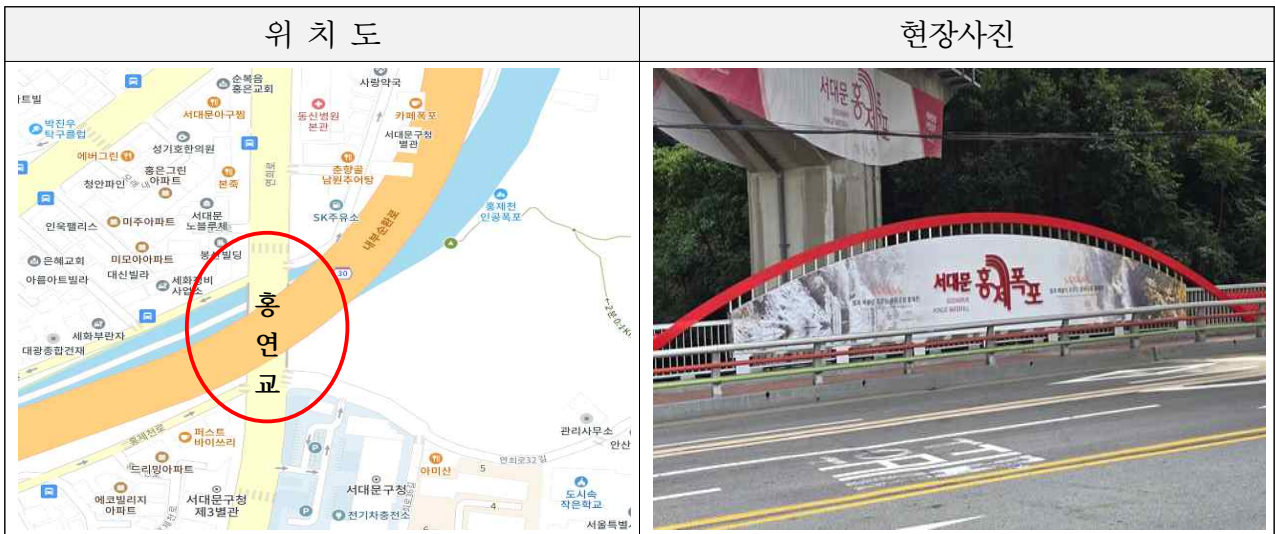

2 무악재 하늘다리 홍보조명 설치 신규

○ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.
- 사업위치 : 서대문구 현저동 1-150
- 사업내용 : 무악재 하늘다리 홍보조명 2개소 설치 등
- 공 사 비 : 80,000천원(구비)

○ 추진현황

- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 2. : 실시설계용역 시행
- 2024. 3. : 공사시행
- 2024. 5. : 공사준공

○ 소요예산 및 집행현황

(단위:천원)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	80,000	69,920	87.4	낙찰차액 미집행
구비	80,000	69,920	87.4	

○ 위치도 및 현장사진



총 소요예산(홍제천 인공폭포 홍보조명+무악재 하늘다리 홍보조명)

구분	소요예산	집행액	집행률(%)	비고
계	230,000	219,920	95.6	낙찰차액 미집행
구비	230,000	219,920	95.6	

기대효과

- 홍연교 이용 차량 및 주민들에게 명승지 홍제천 인공폭포 및 명승지 폭포마당 홍보
- 홍보조명을 설치하여 새로운 이정표(만남의 장소로 활용 등) 탄생으로 서대문구 홍보효과 극대화
